

|                |                 |           |       |                |
|----------------|-----------------|-----------|-------|----------------|
| 平成19年度 事務事業評価表 | 担当              | 建設部 道路建設課 | 内線等   | 2273           |
| 事務事業名          | 市道西中田南湿見1号線整備事業 |           | 事業コード | 3. 建設事業(ハード事業) |
| 根拠法令等          |                 |           | A法令   |                |

総合計画での位置付け

|      |                    |     |    |
|------|--------------------|-----|----|
| 基本目標 | 2. 快適でやすらぎのあるまちづくり | 施策名 | 道路 |
|------|--------------------|-----|----|

事務事業の内容

|         |  |
|---------|--|
| 対象(受益者) | 形原町及び西浦町地域の慢性的な交通渋滞の解消を図るため、                       |
| 手 段     | (仮称)形西線の一部である市道西中田南湿見1号線(形原町西中田～形原町南湿見)を整備することにより、 |
| 想定する成果  | 市民の利便性の向上及び交通安全の確保を図り、観光地へのアクセス道路及び産業振興に寄与する。      |

事業の概要

| 項 目             | 平成18年度実績                         | 平成19年度実績                         | 平成20年度計画                          |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 用地買収面積          | 55.06㎡ / 6,051.38㎡               | 255.39㎡ / 6,051.38㎡              | -                                 |
| 補償件数            | 3件 / 23件                         | 0件 / 23件                         | -                                 |
| 工 事 費<br>(委託料含) | 1,015千円 / 141,785千円<br>(実績 / 計画) | 1,971千円 / 141,785千円<br>(実績 / 計画) | 25,000千円 / 141,785千円<br>(実績 / 計画) |

成果指標

| 成果指標名   | 用地買収率                 | 事業進捗率                |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 成果指標の説明 | 累積買収済面積 / 総買収面積 × 100 | 累積実績事業費 / 総事業費 × 100 |

事業の進捗状況 ( 一般 会計 ) (単位:千円)

|      |      | 平成18年度決算(実績) |     |     |  | 平成19年度決算(実績) |     |     |  | 平成20年度予算(計画) |     |     |  |
|------|------|--------------|-----|-----|--|--------------|-----|-----|--|--------------|-----|-----|--|
| 成果指標 |      | 95.80%       |     |     |  | 100.00%      |     |     |  | -            |     |     |  |
| 成果指標 |      | 96.17%       |     |     |  | 97.99%       |     |     |  | 100.00%      |     |     |  |
| 事業費  | 事業費  | 6,258        |     |     |  | 22,599       |     |     |  | 25,000       |     |     |  |
|      | 人件費  | 7,784        |     |     |  | 7,029        |     |     |  | 7,845        |     |     |  |
|      | (人数) | 正規           | 1.0 | 非常勤 |  | 正規           | 0.9 | 非常勤 |  | 正規           | 1.0 | 非常勤 |  |
|      | 合計   | 14,042       |     |     |  | 29,628       |     |     |  | 32,845       |     |     |  |
| 財源内訳 | 国    |              |     |     |  |              |     |     |  | 9,900        |     |     |  |
|      | 県    |              |     |     |  |              |     |     |  |              |     |     |  |
|      | 市債   |              |     |     |  |              |     |     |  |              |     |     |  |
|      | その他  |              |     |     |  |              |     |     |  |              |     |     |  |
|      | 一般財源 | 14,042       |     |     |  | 29,628       |     |     |  | 22,945       |     |     |  |

事務事業内容の評価

| 項目      | 課内評価 |      | 部長評価 |      | 評価の説明(問題点)                                      |
|---------|------|------|------|------|---|
|         | 19評価 | 16評価 | 19評価 | 16評価 |   |
| 達成度     | 3    | 2    | 3    | 2    | 収用裁決により用地を取得、平成20年度に工事及び供用開始することができる。           |
| 経済効率性   | 1    | 1    | 1    | 1    | 期間が長く、投入された予算にあまり見合った成果をあげていない。                 |
| 事務効率性   | 2    | 2    | 2    | 2    | 投入された人員にほぼ見合った成果をあげることができた。                     |
| 必要性     | 3    | 3    | 3    | 3    | 地域の交通渋滞の解消、生活環境及び産業振興のために市が実施すべき事業である。          |
| 小計      | 9    | 8    | 9    | 8    |   |
| 施策への貢献度 | 3    | -    | 3    | -    | 収用裁決により用地を取得、平成20年度工事を施工することにより、施策の達成をすることができた。 |
| 合計      | 12   | 8    | 12   | 8    |   |

達成度等各項目は、0～3点までの4段階評価

|      |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|
| 総合評価 | A | B | A | B | 市にとって初めて収用裁決により用地を取得。今後の、道路事業の先鞭をなすものとなった。(仮称)形西線の他の路線についても、収用を視野に積極的な対応が必要である。 |
|------|---|---|---|---|---|

総合評価は、A～Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

|                                     |
|-------------------------------------|
| 前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」           |
| 事業認定申請に踏み切る。                        |
| 上記改善点の実施状況                          |
| 事業認定申請後、事業認可を受け、収用裁決及び明け渡し裁決申請を行った。 |

今後さらに改善すべき点


平成21年度予算に反映する項目

今後の方向性

**現状維持**

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

内部管理事務事業、義務的事業は必要性を、また施策名がその他のものは施策への貢献度を評価していません。

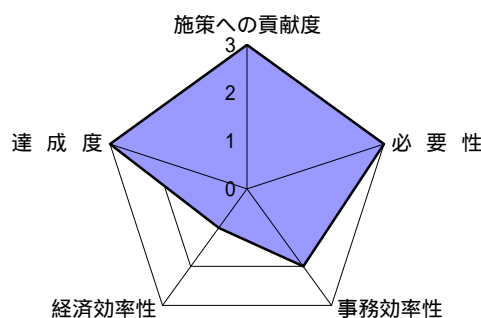

課内評価と部長評価の平均点
