

平成19年度 事務事業評価表		担当	建設部 土木課			内線等	2264
事務事業名	道路新設改良事業				事業コード	3. 建設事業(ハード事業)	
根拠法令等	道路法				A法令		

総合計画での位置付け

基本目標	2. 快適でやすらぎのあるまちづくり	施策名	道路
------	--------------------	-----	----

事務事業の内容

対象(受益者)	中央小学校の通学路である市道緑町旭町1号外1線及び市道中央本町竹谷宮前1号線の
手 段	歩道の拡幅(1.5mを2.5m)や段差の解消をすることにより
想定する成果	歩行者の通行の安全を図る

事業の概要

項 目	平成18年度実績		平成19年度実績		平成20年度計画	
緑町旭町1号線	工事費	27,820千円	工事費	3,600千円	-	
	延長	168m	延長	31m		
栄町旭町1号線	-		工事費	10,610千円	-	
			延長	106m		
中央本町竹谷宮前1号線	-		-		委託費	3,000千円
					延長	350m
					工事費	23,000千円
					延長	130m

成果指標

成果指標名	事業の進捗率	1m当り事業費
成果指標の説明	累計事業費 / 総事業費 × 100	総事業費 / 施工延長

事業の進捗状況 ( 一般 会計 ) (単位:千円)

		平成18年度決算(実績)				平成19年度決算(実績)				平成20年度予算(計画)			
成果指標		73%				100%				41%			
成果指標		180,193円				121,682円				221,121円			
事業費	事業費	27,820				14,210				26,000			
	人件費	2,452				2,461				2,746			
	(人数)	正規	0.3	非常勤	0.05	正規	0.3	非常勤	0.05	正規	0.35	非常勤	
	合計	30,272				16,671				28,746			
財源内訳	国												
	県												
	市債												
	その他												
	一般財源	30,272				16,671				28,746			

事務事業内容の評価

項目	課内評価		部長評価		評価の説明(問題点)
	19評価	16評価	19評価	16評価	
達成度	3	2	3	2	計画どおり平成19年度で事業が完了したので、平成20年度は別の路線で事業を行っていく
経済効率性	2	2	2	2	今後も事業を継続していくので、さらなる経済効率を考 えていく必要がある
事務効率性	3	3	3	3	投入された人員に十分見合った成果をあげている。
必要性	3	3	3	3	市が実施すべき事業である。
小計	11	10	11	10	
施策への貢献度	3	-	3	-	総合計画「施策」の達成に非常に効果がある
合計	14	10	14	10	

達成度等各項目は、0～3点までの4段階評価

総合評価	A	A	A	A	狭い歩道の拡幅と段差の解消は交通安全上や道路のバ リアフリー等からも今後ますます必要な事業である
------	---	---	---	---	---

総合評価は、A～Dまでの4段階評価

前回(H16評価時)「今後改善すべき点」として記載した内容及びその実施状況

前回(H16評価時に)記載した「今後改善すべき点」
平成17年度に工事を行う、それをふまえ改善点があれば改善していく
上記改善点の実施状況
平成17年度に工事を行ったが、改善点は見つからなかった

今後さらに改善すべき点

平成21年度予算に反映する項目


平成21年度も国庫補助事業として事業を行っていく

今後の方向性

**現状維持**

【各部長は、部長評価欄の採点部分だけを記載】

内部管理事務事業、義務的事業は必要性を、また施策名がその他のものは施策への貢献度を評価していません。

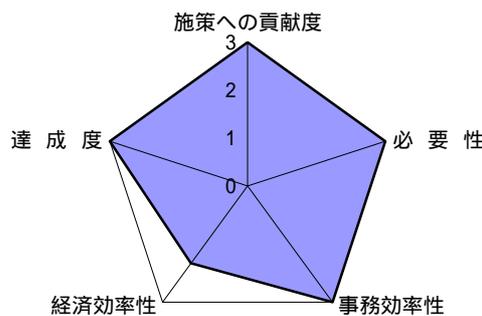

課内評価と部長評価の平均点
