

# 塩津地区学校複合施設建設工事第3回説明会

塩津地区学校複合施設の供用開始時期の変更について

---

蒲郡市役所 建設部 建築住宅課

令和8年1月20日

## 【本日の内容】

- 1 塩津地区学校複合施設の供用開始時期の変更と理由について
- 2 塩津地区学校複合施設建設工事の施工状況について
- 3 質疑応答

# 1 塩津地区学校複合施設の供用開始時期の変更と理由について

## (1) 塩津地区学校複合施設について

小学校棟（小学校、公民館、児童クラブ）



保育園棟

塩津地区学校複合施設完成イメージ図

# 1 塩津地区学校複合施設の供用開始時期の変更と理由について

## (2) 塩津地区学校複合施設の供用開始時期の変更



本日説明会

# 1 塩津地区学校複合施設の供用開始時期の変更と理由について

## (3) 工事期間延長の理由

### 労働基準法の時間外労働規制の影響


- 建設業における働き方改革として、令和6年4月から建設業にも適用されることになった。
- 工事現場における作業可能時間が短くなった。
- 残業などで作業の遅れを取り戻すことが困難になった。

### 熱中症対策義務化の影響

- 労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から特定の条件下で熱中症対策が義務化された。
- 本工事現場では、夏場に建物の躯体工事（柱、梁、壁などの骨組みを施工する工事）と工程が重なったことで炎天下での作業となり、工事進捗に大きな影響が生じた。

- 1 塩津地区学校複合施設の供用開始時期の変更と理由について
  - (4) 工事期間の延長

**労働基準法等法令の遵守  
無理な施工による労働災害の防止  
工事の品質確保**



**工事期間を4ヶ月延長**


(令和8年の夏場の工事も考慮した期間)

## 2 塩津地区学校複合施設建設工事の施工状況



撮影：令和7年6月下旬

## 2 塩津地区学校複合施設建設工事の進捗状況

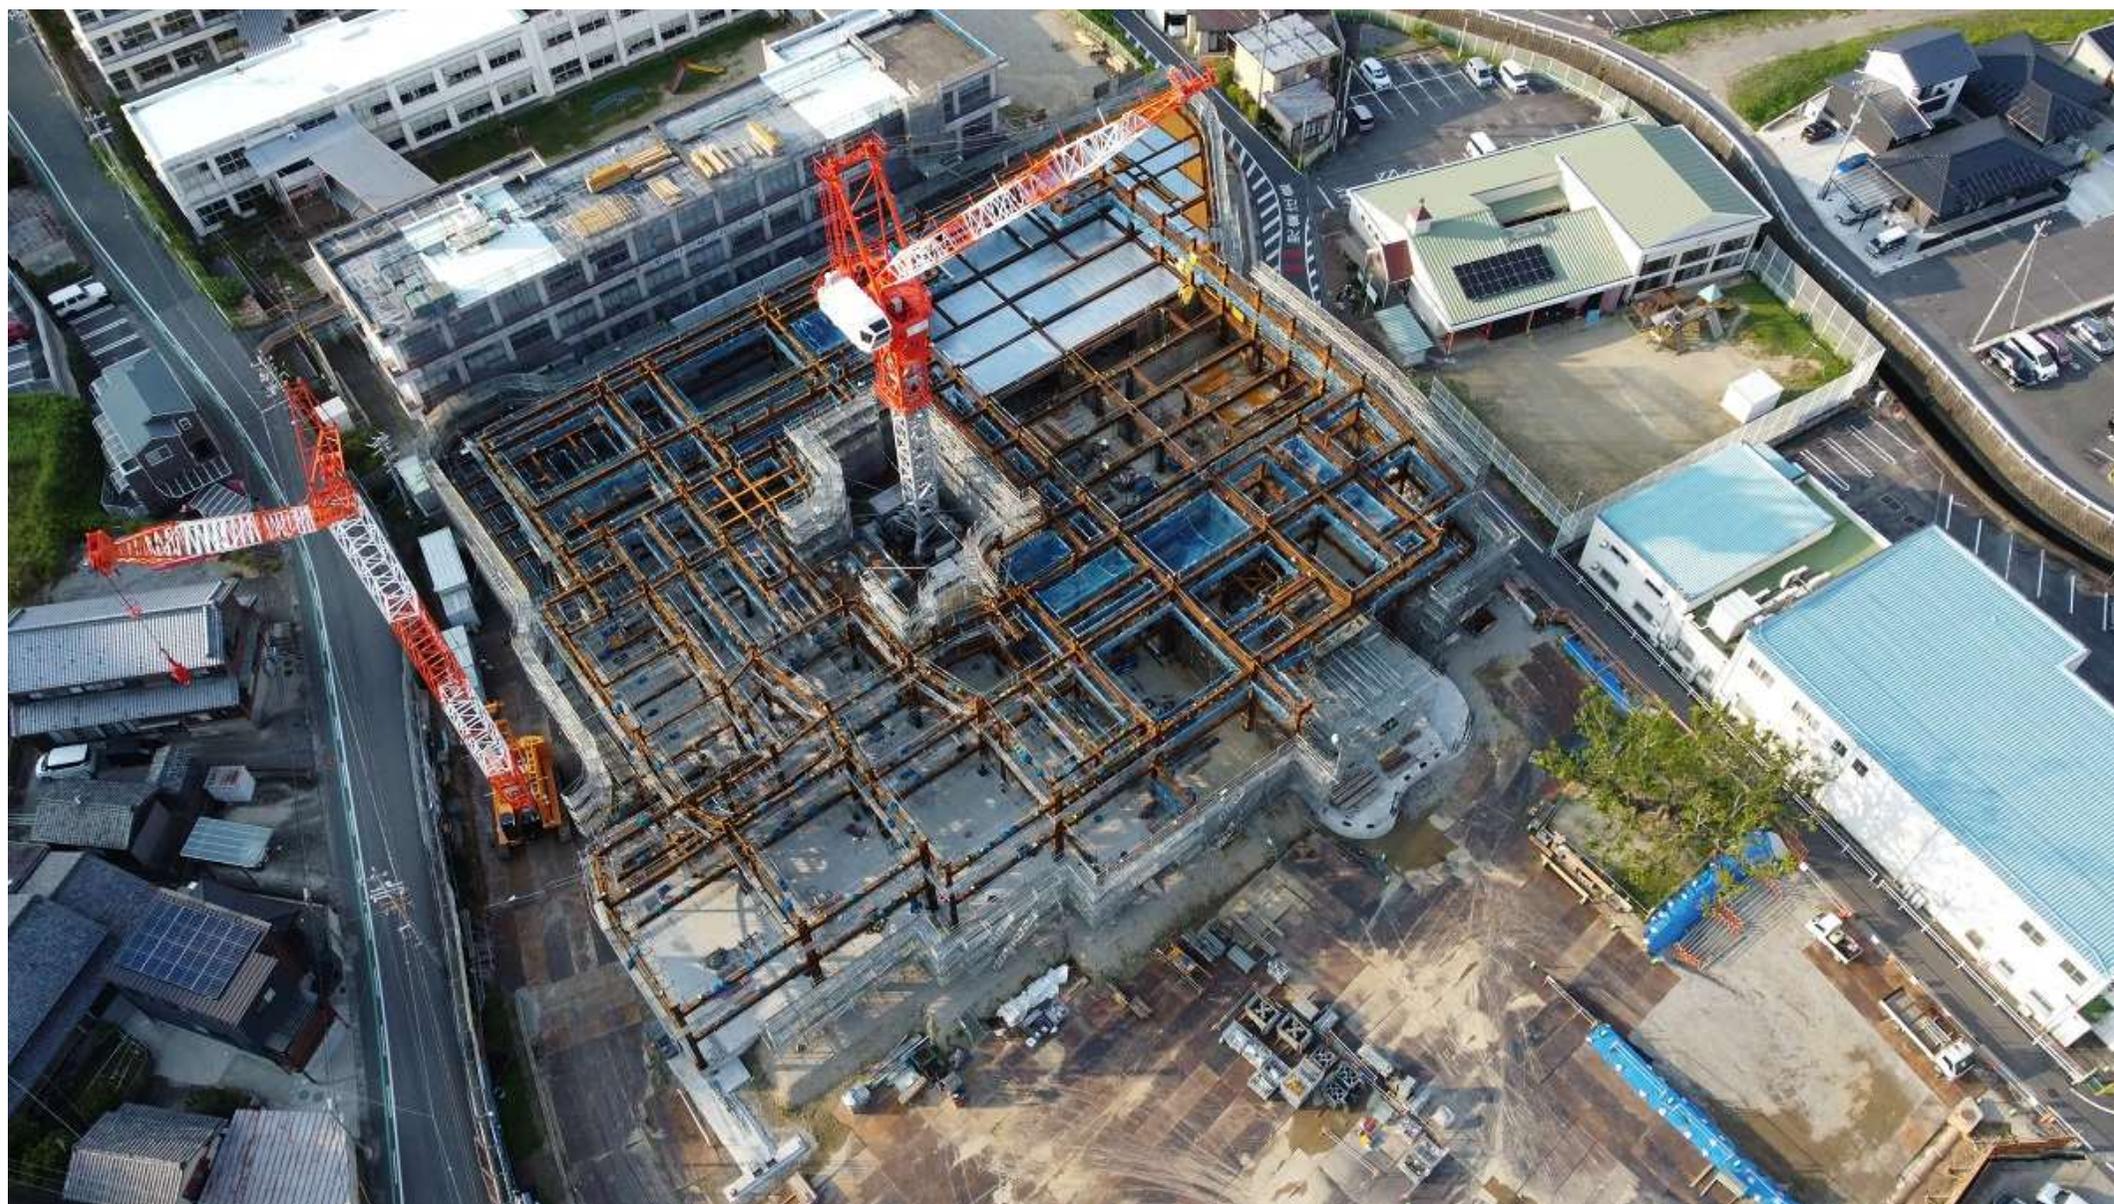


撮影：令和7年7月下旬

## 2 塩津地区学校複合施設建設工事の進捗状況



撮影：令和7年8月下旬

## 2 塩津地区学校複合施設建設工事の進捗状況

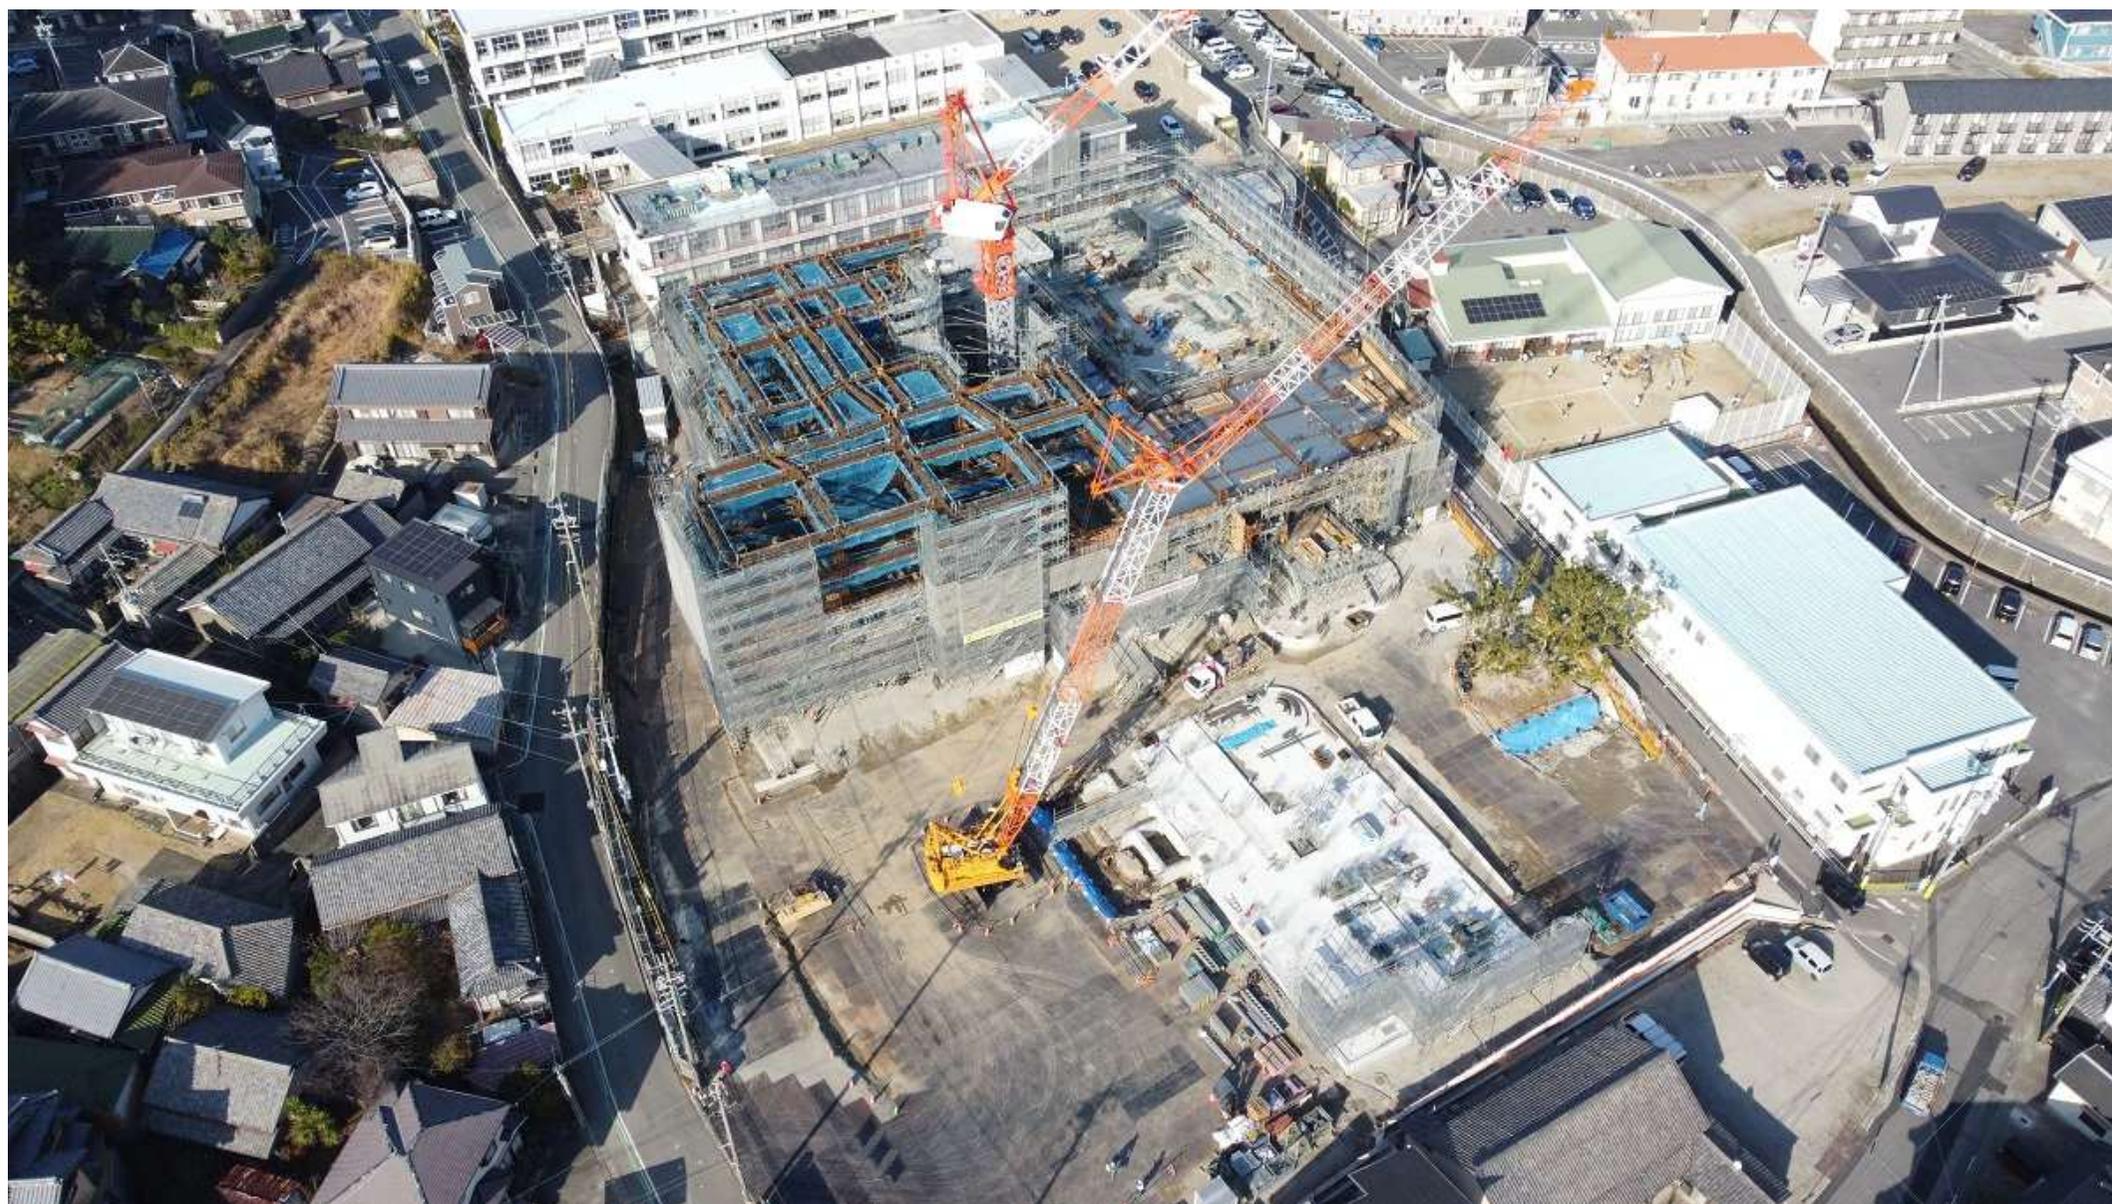

撮影：令和7年12月下旬

# 3 質疑応答

本日ご説明しました期日までに完了する  
よう安全第一に進めてまいりますので、  
引き続き、ご理解・ご協力のほど、  
よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします

