蒲郡市橋梁長寿命化修繕計画

令和５年３月

（令和８年度改訂）

蒲郡市建設部土木港湾課

目　次

1　老朽化対策における基本方針 1

1.1　背景 1

1.2　長寿命化修繕計画の目的 1

1.3　ＳＤＧｓの推進 1

1.4　計画期間 1

2　長寿命化修繕計画の対象橋梁 2

2.1　計画対象の橋梁数 2

2.2　個別施設の状態等 2

3　対策の優先順位の考え方 4

4　新技術の活用方針 4

4.1　補修工事 4

4.2　定期点検 5

5　費用の縮減に関する具体的な方針 5

5.1　予防的な修繕への移行による費用縮減効果 6

5.2　新技術の活用による費用縮減効果 6

5.3　撤去・集約化による費用縮減効果 7

6　対策内容と実施時期 7

7　対策費用 7

1　老朽化対策における基本方針

1.1　背景

蒲郡市の多くの橋梁は高度経済成長期以降において整備され、今後は老朽化した橋梁が増大することが問題となっている。こうした状況の下、今までのような事後的な修繕や架替えでは、更新コストが増大し、適切な維持管理の継続における予算の確保が困難となることが想定される。

1.2　長寿命化修繕計画の目的

上記の背景のもと、今後急速に増大する老朽化した橋梁の維持管理に対応するため、橋梁に著しい損傷が発生してから修繕や架替えを行う事後保全型から、損傷が軽微なうちに修繕し、計画的な架替えを行う予防保全型への円滑な政策転換を図り、橋梁の長寿命化及び維持管理にかかるコストの縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性、信頼性を確保することを目的とする。

1.3　ＳＤＧｓの推進

ＳＤＧｓ（ Sustainable Development Goals ）は、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標であり、１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（ leave no one behind ）」ことを誓い、ＳＤＧｓは発展途上国のみならず先進国自身が取り組む普遍的なものとなっている。

蒲郡市では、「蒲郡市ＳＤＧｓ推進方針」を令和３年６月に改定し、持続可能な開発目標の推進を図るため、蒲郡市橋梁個別施設計画（蒲郡市橋梁長寿命化修繕計画）もその一環として位置づけ、「１１　住み続けられるまちづくりを」の取り組みを進めるものとする。





1.4　計画期間

計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）までの５年間とする。


2　長寿命化修繕計画の対象橋梁

2.1　計画対象の橋梁数


蒲郡市が管理する道路上にある橋長２m以上の橋梁３１７橋とする。

2.2　個別施設の状態等

蒲郡市における供用開始年次別の橋梁数を図－１に示す。現時点において、全体の約１割の橋梁が供用開始から５０年以上を経過しており、供用開始年次が不明な橋梁を含めると全体の約８割を占める。また、供用開始から５０年以上が経過した橋梁数の推移は図－２に示すとおりであり、２０年後には供用開始から５０年以が経過した橋梁は全体の約３割、供用開始年次が不明な橋梁を含めると全体の約９割を占める。

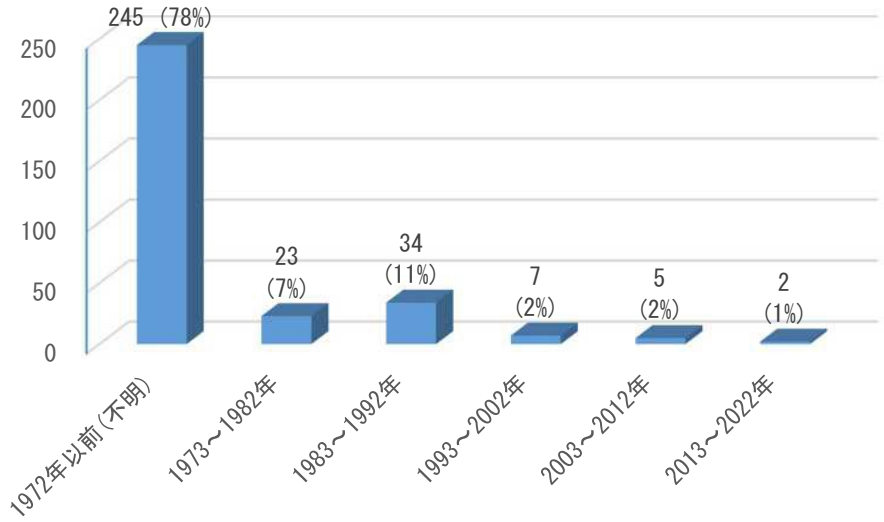


図－１　仮設年次別の橋梁数（令和５年３月末時点）

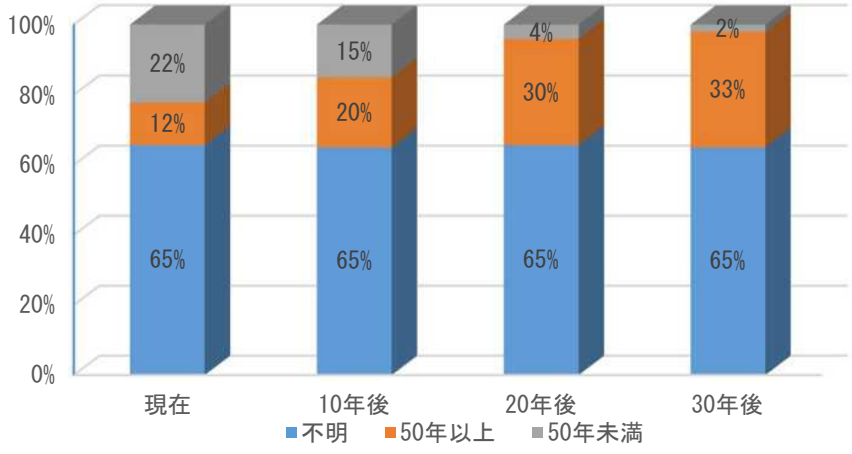

図－２　供用開始年５０年以上の橋梁の推移（令和５年３月末時点）

令和５年３月末時点における定期点検の判定結果は図－３に示すとおりである。橋梁が健全な状態であることを示す判定区分Ⅰとなった橋梁は全体の約６割であった。また、予防保全段階である判定区分Ⅱの橋梁は約３割、早期措置段階である判定区分Ⅲの橋梁は５橋であった。判定区分Ⅲとなった橋梁については、次回定期点検までに修繕を行う必要があるため、計画的に事業を進める必要がある。

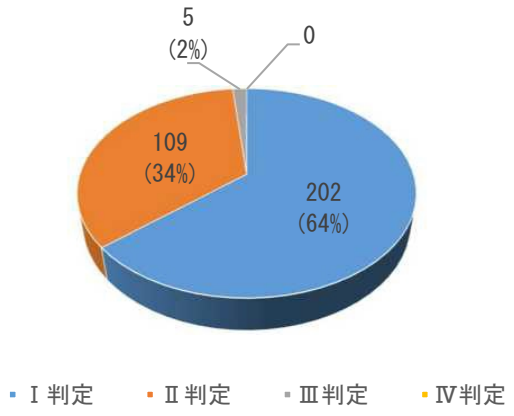

図－３　判定区分別の橋梁数（令和５年３月末時点）

表－１　健全性判定区分

判定区分		定義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

3　対策の優先順位の考え方

各施設の状態の他、果たしている役割や機能、利用状況等を踏まえた対策の優先順位を検討する。優先順位は表－２及び過去の修繕状況や定期点検時に判明した損傷が進行する可能性等を考慮して決定する。鉄道施設に架かる跨線橋については、鉄道事業者と協議のうえ修繕時期を決定する。

表－２　優先順位検討項目一覧表

優先順位	項目
1	定期点検の結果が判定区分Ⅲとなった橋梁（早期措置段階）
2	鉄道施設に架かる跨線橋
3	橋長15m以上の緊急輸送道路上の橋梁
4	橋長15m以上の1級市道上の橋梁
5	橋長15m未満の緊急輸送道路上の橋梁
6	橋長15m未満の1級市道上の橋梁

4　新技術の活用方針

修繕や定期点検等に係る費用の縮減や事業の効率化等を図るため、新技術の活用を検討した長寿命化修繕計画を策定する必要がある。

新技術については、以下のホームページに掲載されている工法等について、従来工法との比較検討をすることで最適な工法を選定する。

・新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）
https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS
・国土交通省「点検支援技術性能カタログ（案）」
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/

4.1　補修工事

補修工事においては、従来工法に対してコスト縮減が見込まれる新技術を検討し、対象となる橋梁の抽出を行う。


4.2 定期点検

定期点検においては、桁下空間や水位及び周辺状況等から新技術を活用することは可能であるが、すべての管理橋梁で近接目視・打音検査を実施することが可能であり、新技術を活用する場合においては従来の点検方法を併用することとなるため、コスト縮減は期待できない。しかし、今後においては損傷の程度や進行状況及び周辺状況等により、コスト縮減が可能は新技術の活用について引き続き検討を実施する。

5 費用の縮減に関する具体的な方針

従来の事後的な修繕から予防的な修繕へ移行することにより、修繕や架替えに係る事業費の大規模化や高コスト化を回避し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図ることで橋梁の長寿命化を目指す。

また、社会経済情勢や施設の利用状況等の変化に応じた適正な配置とすることにより、維持管理に要する費用の縮減を図るため、地元の意見を踏まえて橋梁の集約化・撤去について検討を実施する。

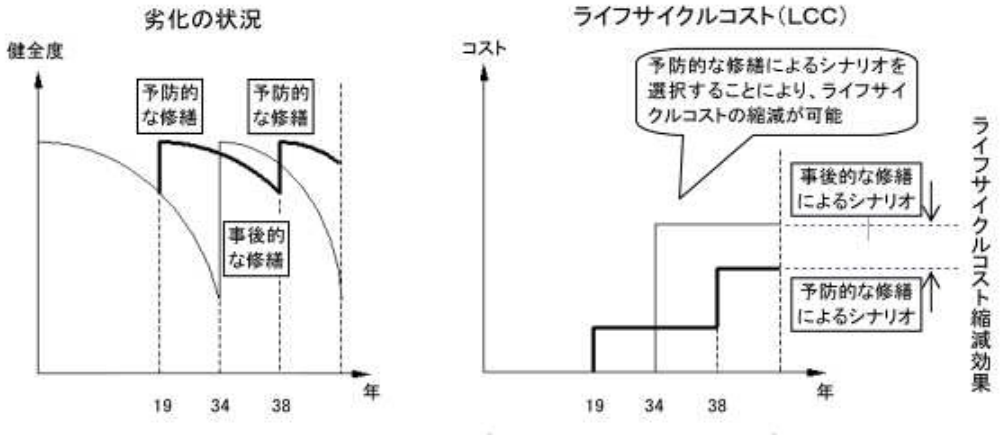


修繕種別	工法(例)	実施サイクル
予防的な修繕	塗装塗替え(ふっ素)＋3種ケレンＡ	19年毎
事後的な修繕	塗装塗替え(ふっ素)＋1種ケレン＋当て板補修	34年毎

図－４　ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）と劣化予測の関連イメージ

5.1　予防的な修繕への移行による費用縮減効果

全管理橋梁(３１７橋)の補修費について、従来の事後的な修繕から予防的な修繕へ移行した場合について、今後５０年間におけるコスト縮減効果を試算したところ、約２２．９億円（約６０％）のコスト縮減効果となった。

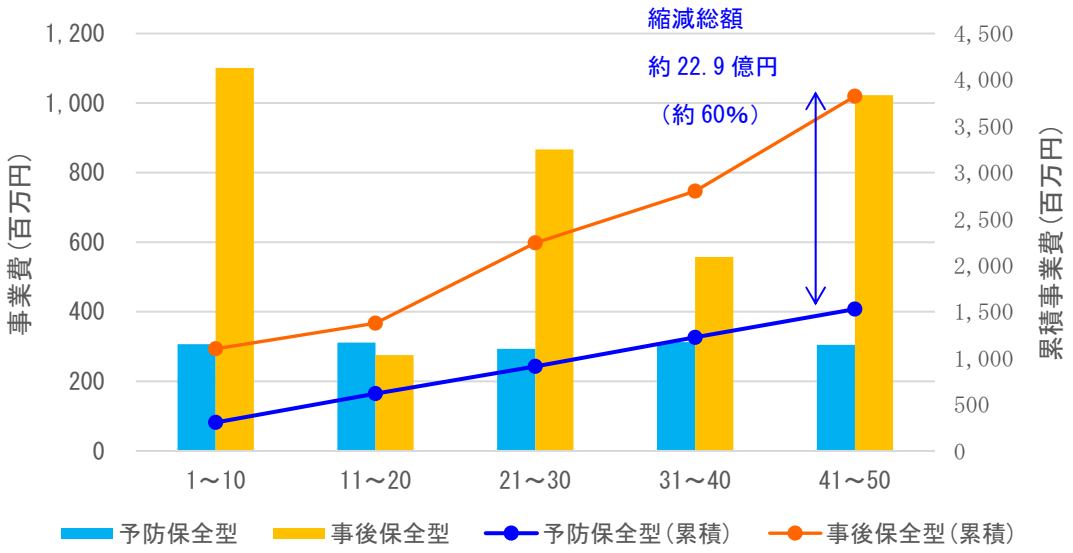

図－５　補修費比較結果

5.2　新技術の活用による費用縮減効果

新技術の活用によるコスト縮減について、新技術情報提供システム(ＮＥＴＩＳ)および国土交通省「点検支援技術性能カタログ（案）」に掲載されている新技術の内、従来技術の補修工法と比較してコスト面での効果が期待できる新技術について検討を行った。新技術を活用した場合と従来技術を活用した場合における経済比較を表－３に示す。今後５年間においては、５橋について新技術を活用することで、約４百万円の費用を縮減することを目標とする。

表－３　新技術経済比較

NETIS 登録番号	QS-150032-VE
技術名称	循環式ハイブリッドブラストシステム
対応施設	鋼橋
単位数量	1000m2
施工費(新技術)	¥9,088,000
施工費(従来工法)	¥11,773,000
コスト縮減	¥2,685,000
対象橋梁数（今後５年）	5 橋

5.3　撤去・集約化による費用縮減効果

定期点検により、判定区分Ⅲとなった橋梁の内、施設の立地及び利用状況に応じた適切な配置とするため、撤去・集約化による費用縮減の検討を行った。撤去した場合と維持管理を継続した場合における経済比較を表－５に示す。今後５年間においては、１橋（無名橋２１７）を撤去することで、約３百万円の費用を縮減することを目標とする。

表－５　撤去・集約化経済比較

撤去費用		補修費用		
工種	費用	施工年次	費用	備　　考
構造物撤去工	740,000	1～10年間	2,850,000	事後保全・点検2回
運搬処理工	80,000	11～20年間	600,000	点検2回
仮設工	140,000	21～30年間	600,000	点検2回
		31～40年間	600,000	点検2回
諸経費	1,440,000	41～50年間	1,100,000	予防保全・点検2回
合計	2,400,000	合計	5,750,000	

6　対策内容と実施時期

対策内容と実施時期及び定期点検の実施時期について別表－１に示す。

7　対策費用

計画期間内に要する対策費用を別表－１に示す。

別表－1

対策内容・実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検・修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
1	無名橋１	不明	2.9	6.8	RC橋	蒲郡市相楽町高田	市道高田門成２号線	委託	2021	Ⅰ												○						
2	無名橋２	不明	4.6	4.1	RC橋	蒲郡市相楽町門成	市道門成４号線	委託	2021	Ⅱ												○						
3	無名橋３	不明	5.3	5.0	RC橋	蒲郡市相楽町門成	市道小畑ケ西川１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
4	五反田橋１	1992	9.4	4.0	PC橋	蒲郡市相楽町溝下	市道溝下五反田２号線	委託	2021	Ⅰ												○						
5	溝下橋	1992	10.4	3.0	PC橋	蒲郡市相楽町溝下	市道溝下久津後１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
6	山神橋	不明	10.6	6.0	PC橋	蒲郡市相楽町門成	市道小畑ケ五月田１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
7	無名橋４	不明	2.3	7.6	RC橋	蒲郡市相楽町小畑ケ	市道下り上ミ１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
8	無名橋５	不明	2.4	1.8	RC橋	蒲郡市相楽町細田	市道相楽細田２号線	委託	2021	Ⅱ												○						
9	無名橋６	不明	2.6	1.0	RC橋	蒲郡市相楽町向前	市道小畑ケ向前１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
10	無名橋７	不明	2.7	1.2	RC橋	蒲郡市相楽町小畑ケ	市道小畑ケ民成１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
11	無名橋８	不明	2.8	4.6	RC橋	蒲郡市相楽町小畑ケ	市道小畑ケ７号線	委託	2021	Ⅱ												○						
12	無名橋９	1989	3.9	3.8	RC橋	蒲郡市相楽町民成り	市道民成向前１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
13	無名橋１０	不明	3.5	4.6	RC橋	蒲郡市大塚町斧磨	市道斧磨２号線	委託	2021	Ⅱ												○						
14	無名橋１１	不明	3.8	6.0	RC橋	蒲郡市大塚町後広畑	市道後広畑１６号線	委託	2021	Ⅱ												○						
15	無名橋１２	不明	4.8	6.0	RC橋	蒲郡市大塚町後広畑	市道耕地海道広畑２号線	委託	2021	Ⅱ												○						
16	無名橋１３	不明	5.1	7.1	RC橋	蒲郡市大塚町斧鹿	市道鎌倉三月田１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
17	大門橋	不明	5.2	19.5	PC橋	蒲郡市大塚町南向山	市道広畑南向山１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
18	広畑橋	1987	5.2	5.0	RC橋	蒲郡市大塚町広畑	市道上向山広畑１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
19	無名橋１４	不明	5.3	4.0	RC橋	蒲郡市大塚町耕地海道	市道耕地海道１５号線	委託	2021	Ⅰ												○						
20	丹下橋	不明	5.6	9.3	RC橋	蒲郡市大塚町大門	市道西島丸山１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
21	丹下橋（上流歩道）	不明	5.6	1.9	RC橋	蒲郡市大塚町大門	市道西島丸山１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
22	丹下橋（下流歩道）	不明	8.7	2.2	鋼橋	蒲郡市大塚町大門	市道西島丸山１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
23	無名橋１５	1989	5.7	10.3	RC橋	蒲郡市大塚町広畑	市道広畑松下１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
24	無名橋１６	不明	6.0	7.8	RC橋	蒲郡市大塚町耕地海道	市道大門民成１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
25	無名橋１７	不明	6.2	6.5	RC橋	蒲郡市大塚町耕地海道	市道耕地海道広畑１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
26	無名橋１８	1985	3.7	1.5	RC橋	蒲郡市大塚町上中島	市道笹子上中島１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
27	無名橋１９	不明	4.2	4.4	RC橋	蒲郡市大塚町柴垣	市道西島鎌倉１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
28	無名橋２０	不明	4.4	4.3	RC橋	蒲郡市大塚町上中島	市道上中島端城１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
29	丸差橋	不明	5.2	5.9	RC橋	蒲郡市大塚町紫垣	市道西島丸山１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
30	丸差橋（上流歩道）	不明	6.0	1.2	鋼橋	蒲郡市大塚町上中島	市道西島丸山１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
31	無名橋２１	不明	2.6	3.7	RC橋	蒲郡市大塚町原山	市道下長尾原山１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
32	無名橋２２	不明	3.6	2.2	RC橋	蒲郡市大塚町下千尾	市道杭内下千尾１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
33	無名橋２３	不明	3.6	4.6	RC橋	蒲郡市大塚町勝川	市道勝川仲野１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
34	無名橋２４	不明	3.7	2.2	RC橋	蒲郡市大塚町下千尾	市道下千尾杭内１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
35	勝川橋（上流歩道）	1933	4.7	2.0	鋼橋	蒲郡市大塚町杭内	市道西屋敷西島１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
36	勝川橋（下流歩道）	1933	5.4	1.4	鋼橋	蒲郡市大塚町杭内	市道西屋敷西島１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
37	無名橋２５	不明	3.8	3.1	RC橋	蒲郡市大塚町杭内	市道大塚原山７号線	委託	2021	Ⅱ												○						
38	無名橋２６	不明	3.8	9.5	RC橋	蒲郡市大塚町原山	市道下千尾７号線	委託	2021	Ⅱ												○						
39	勝川橋	1996	4.7	10.2	RC橋	蒲郡市大塚町下千尾	市道西屋敷西島１号線	委託	2021	Ⅱ												○						
40	無名橋２７	不明	6.3	3.5	RC橋	蒲郡市大塚町蔵屋敷	市道平原西屋敷１号線	委託	2021	Ⅰ												○						
41	無名橋２８	不明	7.5	4.0	RC橋	蒲郡市大塚町上長尾	市道下千尾７号線	委託	2021	Ⅰ												○						
42	無名橋３２	1992	4.4	7.2	RC橋	蒲郡市三谷町弥生一丁目	市道三谷東４９号線	委託	2022	Ⅰ														○				
43	緑橋	1952	4.6	6.9	RC橋	蒲郡市三谷町二舗	市道五舗二舗１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
44	無名橋３４	不明	6.0	1.6	PC橋	蒲郡市三谷町五舗	市道五舗１５号線	委託	2022	Ⅰ														○				

別表－1

対策内容・実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検・修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
45	松前橋	1966	12.2	4.5	PC橋	蒲郡市三谷町港町通	市道港町通松前２号線	委託	2022	Ⅱ														○				
46	無名橋３６	不明	5.0	2.0	RC橋	蒲郡市清田町大駄和	市道大駄和２０号線	委託	2022	Ⅰ														○				
47	三反田橋	不明	8.0	4.1	RC橋	蒲郡市清田町三反田	市道三反田石原１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
48	葉蒲橋	不明	9.0	4.4	鋼橋	蒲郡市清田町葉蒲	市道前田石原１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
49	無名橋３９	1985	9.2	1.8	鋼橋	蒲郡市平田町二反田	市道平田二反田７号線	委託	2022	Ⅰ														○				
50	岡橋	1954	9.3	3.6	RC橋	蒲郡市清田町上中郷	市道上中郷木森１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
51	太駄橋	不明	10.4	11.4	RC橋	蒲郡市平田町松下	市道門田五井下長根１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
52	中岡人道橋	不明	10.6	1.0	その他	蒲郡市清田町岡前	市道岡前下中郷１号線	委託	2021	Ⅱ			2020.11	2020.12	高欄補修等	0.9							○					
53	岡海道人道橋	不明	10.9	1.9	鋼橋	蒲郡市清田町橋詰	市道橋詰岡海道２号線	委託	2022	Ⅰ														○				
54	神前橋	1965	11.5	4.0	PC橋	蒲郡市清田町橋詰	市道橋詰木森１号線	委託	2022	Ⅰ			2022.2	2022.3	高欄補修	0.9								○				
55	橋詰橋	1976	11.6	3.6	PC橋	蒲郡市清田町橋詰	市道五反田橋詰１号線	委託	2022	Ⅰ			2024.9	2024.10	床板補修	0.1				○				○				
56	無名橋４３	不明	11.9	1.2	その他	蒲郡市清田町	市道東大内井戸ケ沢１号線	委託	2021	Ⅰ			2025.03	2025.03	撤去	0.4				△								
57	無名橋４４	1981	12.0	2.3	鋼橋	蒲郡市水竹町沖田	市道下沖田古道１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
58	無名橋４５	不明	12.0	0.8	その他	蒲郡市清田町井戸ケ沢	市道上大内井戸ケ沢１号線	委託	2021	Ⅰ													○					
59	葉蒲人道橋	不明	12.6	2.0	鋼橋	蒲郡市清田町三反田	市道三反田葉蒲１号線	委託	2022	Ⅰ	2022.12	2023.01	2024.09	2024.10	床版補修	0.4				○				○				
60	平田橋	1963	12.6	4.5	PC橋	蒲郡市平田町西長根	市道門田姥子１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
61	西郷橋	1955	14.0	4.0	RC橋	蒲郡市清田町橋詰	市道小井戸上青山１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
62	大塔橋	1993	16.2	17.4	PC橋	蒲郡市水竹町上大塔	市道前道下上大内1号線	委託	2025	Ⅱ	2015.03	2016.02	2015.12	2016.05	伸縮装置取替	35.0					○					○	断面修復	1.3	
63	記念橋	不明	20.7	15.0	PC橋	蒲郡市三谷北通六丁目	市道十舗新井前1号線	委託	2025	Ⅱ	2016.03	2017.03	2017.03	2017.07	断面修復	12.0					○					○	ひび割れ補修	1.7	
64	五反田橋	1985	22.8	8.0	PC橋	蒲郡市府相町二丁目	市道西田川21号線	委託	2025	Ⅱ	2015.03	2016.02	2015.12	2016.05	伸縮装置取替	11.3					○							
65	西田川橋	1972	22.9	12.0	PC橋	蒲郡市三谷北通六丁目	市道西田川31号線	委託	2025	Ⅰ	2022.09	2023.02	2023.10	2024.06	橋面防水、舗装補修、防護柵補修、排水管補修	24.7		○		○	○							
66	西田橋	1972	24.5	15.0	PC橋	蒲郡市三谷町九舗	市道七舗港町1号線	委託	2025	Ⅱ											○					○	ひび割れ補修	6.5	
67	昭和橋１	1986	28.7	10.7	鋼橋	蒲郡市丸山町	市道西畑丸山町1号線	委託	2025	Ⅰ	2018.09	2019.01	2021.09	2022.03	塗装塗替	135.7					○							
68	中郷橋	1993	35.3	20.9	PC橋	蒲郡市清田町岡	市道堀込上大内１号線	委託	2025	Ⅱ	2019.08	2019.11	2020.08	2021.01	伸縮装置取替	56.4					○					○	ひび割れ補修	3.2	
69	小崎橋	1976	41.2	12.0	PC橋	蒲郡市府相町三丁目	市道西田川52号線	委託	2025	Ⅱ	2016.03	2017.03	2017.03	2017.07	断面修復	30.0					○					□	ひび割れ補修	5.5	
70	無名橋４７	不明	3.5	4.1	RC橋	蒲郡市豊岡町走り田	市道走り田中屋敷２号線	委託	2022	Ⅱ														○				
71	無名橋４８	不明	3.8	1.5	RC橋	蒲郡市豊岡町上長根	市道上長根小丸山１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
72	無名橋４９	不明	3.9	2.5	RC橋	蒲郡市豊岡町走り田	市道走り田中屋敷１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
73	無名橋５０	不明	3.9	4.0	RC橋	蒲郡市豊岡町砂田	市道走り田中屋敷３号線	委託	2022	Ⅰ														○				
74	無名橋５１	不明	4.0	1.7	RC橋	蒲郡市豊岡町国府地川	市道国府地川川縁り１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
75	無名橋５２	不明	4.0	1.3	その他	蒲郡市豊岡町小丸山	市道豊岡上長根１０号線	委託	2021	Ⅱ													○					
76	無名橋５３	不明	4.2	3.5	鋼橋	蒲郡市豊岡町川縁り	市道国府地川４号線	委託	2022	Ⅰ														○				
77	無名橋５４	1985	4.2	3.4	RC橋	蒲郡市豊岡町上長根	市道豊岡上長根小丸山２号線	委託	2022	Ⅰ														○				
78	砂田橋	1971	4.3	3.4	RC橋	蒲郡市豊岡町砂田	市道清水砂田１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
79	無名橋５５	不明	4.5	2.5	RC橋	蒲郡市豊岡町川縁り	市道国府地川川縁り２号線	委託	2022	Ⅱ														○				
80	東公橋	1973	4.7	5.5	RC橋	蒲郡市豊岡町川縁り	市道殿門３号線	委託	2022	Ⅰ														○				
81	無名橋５６	不明	4.8	4.6	RC橋	蒲郡市豊岡町中屋敷	市道国府地川走り田１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
82	殿門橋	1998	5.5	4.5	RC橋	蒲郡市豊岡町殿門	市道殿門平田門１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
83	無名橋５７	不明	5.7	1.3	RC橋	蒲郡市豊岡町満土呂	市道満土呂１０号線	委託	2022	Ⅰ														○				
84	天王橋	1975	6.0	6.0	RC橋	蒲郡市豊岡町石田	市道満土呂石田１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
85	力橋	1972	9.4	12.0	PC橋	蒲郡市三谷北通四丁目	市道西田川５４号線	委託	2022	Ⅱ														○				
86	力川橋	不明	12.4	15.0	PC橋	蒲郡市三谷北通四丁目	市道十舗新井前１号線	委託	2021	Ⅱ													○					
87	半ノ木橋	1973	12.6	8.0	PC橋	蒲郡市三谷北通四丁目	市道西田川８号線	委託	2022	Ⅱ														○				
88	無名橋５９	不明	12.9	16.0	RC橋	蒲郡市豊岡町六ツ田	市道三谷北通満土呂１号線	委託	2021	Ⅱ													○					

別表－1

対策内容・実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検・修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
89	無名橋６０	不明	3.0	2.2	PC橋	蒲郡市豊岡町山林	市道山林１３号線	委託	2022	Ⅰ														○				
90	無名橋６１	不明	4.3	3.9	RC橋	蒲郡市豊岡町川縁り	市道殿門平田門１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
91	無名橋６２	不明	4.5	4.0	RC橋	蒲郡市豊岡町八ッ田	市道八ツ田２号線	委託	2022	Ⅰ														○				
92	無名橋６３	不明	4.5	1.5	RC橋	蒲郡市豊岡町イヨ	市道イヨ八ツ田１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
93	無名橋６４	不明	4.9	2.0	RC橋	蒲郡市豊岡町松海道	市道松海道長田１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
94	無名橋６５	不明	5.3	1.5	RC橋	蒲郡市豊岡町山林	市道山林３号線	委託	2022	Ⅱ														○				
95	無名橋６６	不明	5.3	6.0	RC橋	蒲郡市豊岡町イヨ	市道イヨ黒岩１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
96	無名橋６７	不明	5.6	3.6	RC橋	蒲郡市豊岡町平田門	市道松海道平田門１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
97	無名橋６８	不明	6.3	2.2	鋼橋	蒲郡市豊岡町山林	市道八ツ田黒岩１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
98	無名橋６９	不明	7.3	4.0	PC橋	蒲郡市豊岡町黒岩	市道黒岩１１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
99	無名橋７０	不明	2.5	1.9	RC橋	蒲郡市平田町松下	市道平田松下６号線	委託	2022	Ⅰ														○				
100	無名橋７１	不明	2.6	10.6	RC橋	蒲郡市五井町高立田	市道高立田５号線	委託	2022	Ⅰ														○				
101	無名橋７２	不明	2.9	3.0	RC橋	蒲郡市五井町上長根	市道上長根小井戸１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
102	無名橋７３	不明	3.4	3.0	RC橋	蒲郡市平田町向田	市道平田松下１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
103	無名橋７４	不明	2.5	1.3	RC橋	蒲郡市五井町西郷	市道五井西郷７号線	委託	2021	Ⅰ													○					
104	無名橋７５	不明	3.6	2.9	RC橋	蒲郡市五井町西郷	市道五井西郷８号線	委託	2022	Ⅱ														○				
105	無名橋７７	不明	4.0	1.6	鋼橋	蒲郡市清田町上新屋	市道上里６号線	委託	2022	Ⅲ	2022.12	2023.01	2024.02	2024.03	床版取替	1.8		○						○				
106	無名橋７８	1981	4.3	3.8	RC橋	蒲郡市清田町膳棚	市道膳棚２号線	委託	2022	Ⅰ														○				
107	無名橋７９	不明	4.6	3.2	RC橋	蒲郡市清田町上大内	市道上里５号線	委託	2022	Ⅰ														○				
108	無名橋８０	不明	5.4	5.0	RC橋	蒲郡市清田町上大内	市道上里７号線	委託	2022	Ⅰ														○				
109	無名橋８１	不明	5.6	3.5	RC橋	蒲郡市清田町上新屋	市道上新屋上里１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
110	無名橋８２	不明	6.9	2.2	RC橋	蒲郡市清田町上大内	市道上里１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
111	亀塚橋	1925	4.0	4.7	RC橋	蒲郡市松原町	市道松原町３号線	委託	2021	Ⅰ													○					
112	榎田橋	不明	8.0	5.7	RC橋	蒲郡市松原町	市道松原町１４号線	委託	2021	Ⅰ													○					
113	無名橋８３	不明	5.0	4.1	RC橋	蒲郡市坂本町深山	市道坂本前田大澤１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
114	無名橋８４	1982	5.8	1.5	RC橋	蒲郡市坂本町深山	市道深山醢梨１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
115	無名橋８５	不明	6.0	2.0	RC橋	蒲郡市坂本町坂口	市道坂口須田１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
116	無名橋８６	不明	6.1	6.0	RC橋	蒲郡市坂本町深山	市道坂本前田大澤１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
117	水間橋	不明	6.1	2.0	RC橋	蒲郡市坂本町松ノ木	市道助坊１１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
118	無名橋８７	不明	6.3	1.7	RC橋	蒲郡市坂本町醢梨	市道松ノ木４号線	直営	2023	Ⅰ							○											
119	前田橋	1979	6.6	2.0	PC橋	蒲郡市坂本町前田	市道向郷４号線	直営	2023	Ⅰ							○											
120	無名橋８８	不明	6.6	2.0	RC橋	蒲郡市坂本町助坊	市道須田深山１号線	委託	2021	Ⅱ													○					
121	無名橋８９	不明	7.7	4.6	RC橋	蒲郡市坂本町中屋敷	市道須田助坊１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
122	滝前橋	1989	8.3	6.0	PC橋	蒲郡市坂本町髭梨	市道坂本前田大澤１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
123	向郷橋	1967	8.5	4.0	PC橋	蒲郡市坂本町広畑	市道坂本前田須田１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
124	西川原橋	1958	9.6	7.5	その他	蒲郡市水竹町西川原	市道宮成町清田前田１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
125	高砂橋	1988	9.6	6.0	PC橋	蒲郡市坂本町須田	市道坂本前田大澤１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
126	貴船橋	1960	9.8	4.6	RC橋	蒲郡市神ノ郷町国京	市道貴船東川原１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
127	向田橋	不明	10.0	4.5	鋼橋	蒲郡市水竹町西川原	市道向田下新屋１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
128	東川原橋	1964	10.7	4.5	PC橋	蒲郡市水竹町西清水川	市道東清水川東川原２号線	直営	2023	Ⅰ							○											
129	公園橋	1980	11.4	12.0	PC橋	蒲郡市神ノ郷町東川原	市道下島東川原２号線	直営	2023	Ⅰ			2024.7	2024.8	排水管補修	0.4	○			○								
130	川原橋	不明	11.5	6.0	PC橋	蒲郡市水竹町下川原	市道大坪東川原１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
131	下り橋	不明	12.0	1.7	鋼橋	蒲郡市神ノ郷町下り橋	市道国京宮成町１号線	直営	2023	Ⅰ	2022.12	2023.01	2025.02	2025.03	床版取替、防護柵工	3.0	○	○										
132	大神橋	1965	13.6	6.5	PC橋	蒲郡市宮成町	市道宮成町清田前田１号線	直営	2023	Ⅱ							○											

別表－1

対策内容・実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検・修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
133	潮止橋	1970	15.0	15.0	PC橋	蒲郡市栄町	市道港町栄町1号線	委託	2025	Ⅱ	2013.07	2013.12	2014.06	2014.11	表面被覆	17.0					○					□	断面修復、ひび割れ補修	5.5	
134	冷越橋	不明	16.0	12.0	PC橋	蒲郡市緑町	市道中央本町竹谷宮前1号線	委託	2025	Ⅱ	2017.03	2018.03	2018.06	2018.11	断面修復	23.0					○					□	断面修復、ひび割れ補修、排水管補修	5.5	
135	ミドリ橋	1990	17.0	1.5	鋼橋	蒲郡市緑町	市道緑町和合１号線	委託	2025	Ⅰ											○							
136	大宮橋	2008	19.0	15.0	PC橋	蒲郡市緑町	市道宮成町小敷塚1号線	委託	2025	Ⅰ											○							
137	大口橋	1977	21.9	7.0	PC橋	蒲郡市坂本町向郷	市道宮成町坂本前田1号線	委託	2025	Ⅱ											○							
138	旭橋	1979	24.8	6.0	PC橋	蒲郡市旭町	市道地蔵ﾶ崎江尻1号線	委託	2025	Ⅱ											○							
139	平和橋	1982	31.5	12.0	PC橋	蒲郡市蒲郡町貴船	市道宮成町坂本前田1号線	委託	2025	Ⅱ	2014.06	2014.12	2014.12	2015.03	橋面防水	27.0					○					□	断面修復、ひび割れ補修	5.5	
140	城山橋	1959	4.0	5.3	RC橋	蒲郡市神ノ郷町後田	市道後田中山本１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
141	無名橋９２	不明	4.2	1.0	RC橋	蒲郡市神ノ郷町山見堂	市道兼京３号線	委託	2021	Ⅱ													○					
142	市場橋	1979	4.4	3.0	RC橋	蒲郡市神ノ郷町森	市道森殿市場１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
143	無名橋９３	不明	4.6	3.8	RC橋	蒲郡市神ノ郷町高松	市道矢倉場兼京１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
144	無名橋９４	1981	4.8	2.0	RC橋	蒲郡市神ノ郷町森	市道森１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
145	無名橋９５	不明	4.9	4.7	RC橋	蒲郡市神ノ郷町新林	市道新林高保炉１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
146	無名橋９６	不明	5.1	1.5	RC橋	蒲郡市神ノ郷町高松	市道高松兼京１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
147	無名橋９７	不明	5.2	3.0	RC橋	蒲郡市神ノ郷町後田	市道後田中山本２号線	直営	2023	Ⅰ							○											
148	無名橋９８	1991	5.5	8.7	RC橋	蒲郡市神ノ郷町新林	市道新林高保炉２号線	直営	2023	Ⅰ							○											
149	無名橋９９	不明	5.7	3.4	RC橋	蒲郡市神ノ郷町森	市道森殿市場２号線	直営	2023	Ⅰ							○											
150	宮前橋	1961	5.8	3.6	RC橋	蒲郡市神ノ郷町森前	市道宮成森前１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
151	兼京橋	1970	6.4	7.2	RC橋	蒲郡市神ノ郷町矢倉場	市道宮成町清田前田１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
152	国京橋	1966	8.2	6.8	RC橋	蒲郡市神ノ郷町森前	市道宮成町坂本前田１号線	委託	2022	Ⅱ															○			
153	無名橋１００	1982	2.5	2.0	RC橋	蒲郡市坂本町中屋敷	市道坂本中屋敷６号線	直営	2023	Ⅰ							○											
154	無名橋１０１	不明	2.6	3.6	RC橋	蒲郡市坂本町中屋敷	市道須田助坊１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
155	無名橋１０２	1985	2.8	3.4	RC橋	蒲郡市坂本町坂口	市道坂口中屋敷１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
156	無名橋１０３	不明	2.9	2.7	RC橋	蒲郡市坂本町中屋敷	市道中屋敷深山１号線	委託	2021	Ⅱ													○					
157	持山橋	不明	10.6	5.2	RC橋	蒲郡市坂本町持山	市道持山１５号線	直営	2023	Ⅰ							○											
158	無名橋１０４	不明	2.3	3.2	RC橋	蒲郡市坂本町坂口	市道坂口助坊１号線	委託	2021	Ⅱ													○					
159	無名橋１０５	不明	3.0	6.9	RC橋	蒲郡市坂本町坂口	市道中屋敷深山１号線	委託	2021	Ⅰ													○					
160	無名橋１０６	1989	3.7	3.9	RC橋	蒲郡市坂本町坂口	市道須田助坊１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
161	無名橋１０７	1991	3.8	1.0	その他	蒲郡市坂本町坂口	市道助坊１号線	委託	2021	Ⅰ													○					
162	無名橋１０８	不明	3.9	4.6	RC橋	蒲郡市坂本町大沢	市道坂本大澤１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
163	無名橋１０９	1985	2.4	4.1	RC橋	蒲郡市柏原町坂野	市道坂野３号線	直営	2023	Ⅰ							○											
164	無名橋１１０	不明	4.1	4.0	RC橋	蒲郡市柏原町坂野	市道水洗坂野１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
165	無名橋１１１	不明	4.9	2.0	RC橋	蒲郡市竹谷町大久古	市道大久古八ツケ口１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
166	無名橋１１２	不明	5.3	3.0	RC橋	蒲郡市竹谷町八ッヶ口	市道八ツケ口坂野１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
167	無名橋１１３	不明	6.1	4.0	RC橋	蒲郡市柏原町川原	市道川原竹谷池下１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
168	無名橋１１４	1982	6.5	4.0	RC橋	蒲郡市柏原町川原	市道川原大久古１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
169	無名橋１１５	1985	6.5	2.3	鋼橋	蒲郡市柏原町川原	市道八ツケ口３号線	直営	2023	Ⅰ							○											
170	神田橋	1968	7.1	8.1	RC橋	蒲郡市竹谷町横井	市道野川宮前１号線	直営	2023	Ⅱ							○											
171	川原橋	1971	7.2	3.9	RC橋	蒲郡市柏原町川原	市道川原竹谷池下２号線	直営	2023	Ⅱ							○											
172	尺地橋	1967	7.7	6.5	PC橋	蒲郡市竹谷町一ノ坪	市道一ノ坪７号線	直営	2024	Ⅱ									○									
173	無名橋１１６	不明	7.8	1.3	鋼橋	蒲郡市竹谷町東作間	市道東作間３号線	委託	2021	Ⅰ													○					
174	大迫橋	1999	8.4	2.5	PC橋	蒲郡市柏原町大迫	市道柏原大迫１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
175	作間橋	1973	8.7	5.6	RC橋	蒲郡市竹谷町横井	市道宮前作間１号線	直営	2023	Ⅰ							○											
176	横井橋	不明	8.7	3.0	鋼橋	蒲郡市竹谷町横井	市道宮前横井１号線	直営	2023	Ⅰ							○											

別表－1

対策内容・実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検・修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
177	道泉橋	1976	8.9	5.0	RC橋	蒲郡市竹谷町井ノ上	市道加治替戸中長１号線	直営	2023	Ⅱ							○												
178	塩田橋	1959	11.4	4.5	RC橋	蒲郡市竹谷町梅藪	市道竹谷前浜栄町１号線	委託	2022	Ⅱ															○				
179	浜田橋	2007	17.2	6.5	PC橋	蒲郡市竹谷町蟹洗	市道蟹洗浜田2号線	委託	2025	Ⅰ											○								
180	無名橋１１９	不明	3.8	2.5	RC橋	蒲郡市柏原町川添	市道川原石神１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
181	無名橋１２０	1990	3.8	4.0	RC橋	蒲郡市柏原町堂山	市道堂山５号線	直営	2023	Ⅰ							○												
182	無名橋１２１	不明	3.8	7.7	RC橋	蒲郡市柏原町石神	市道石神中原１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
183	無名橋１２２	1984	4.2	4.0	RC橋	蒲郡市柏原町石神	市道川原石神２号線	直営	2023	Ⅰ							○												
184	無名橋１２３	不明	2.3	4.5	RC橋	蒲郡市柏原町桜迫	市道外田坂野１号線	直営	2023	Ⅱ							○												
185	無名橋１２４	不明	2.7	4.3	RC橋	蒲郡市柏原町坂野	市道坂野八ツケ口１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
186	無名橋１２５	不明	2.9	1.0	RC橋	蒲郡市鹿島町深田	市道桜迫１号線	委託	2021	Ⅰ													○						
187	無名橋１２６	不明	3.1	4.0	RC橋	蒲郡市竹谷町八ッケ口	市道水洗坂野１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
188	無名橋１２７	不明	3.1	4.1	RC橋	蒲郡市柏原町桜迫	市道坂野５号線	直営	2023	Ⅰ							○												
189	無名橋１２８	不明	2.5	10.0	RC橋	蒲郡市西迫町向ヒ山	市道西迫７号線	直営	2023	Ⅰ							○												
190	無名橋１２９	不明	2.8	7.2	RC橋	蒲郡市西迫町田部	市道西迫９号線	直営	2023	Ⅰ							○												
191	無名橋１３０	不明	3.4	9.7	RC橋	蒲郡市西迫町田部	市道西迫８号線	直営	2023	Ⅱ							○												
192	無名橋１３１	不明	4.6	3.5	RC橋	蒲郡市竹谷町七反	市道西ケ崎足洗１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
193	都橋	1979	5.7	7.4	PC橋	蒲郡市竹谷町元町	市道錦田日坂野１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
194	無名橋１３２	1985	6.0	5.0	PC橋	蒲郡市竹谷町西ヶ崎	市道竹谷足洗西ケ崎１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
195	井瀬木橋	1986	8.0	7.6	PC橋	蒲郡市竹谷町浜家	市道浜家井瀬木１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
196	竹谷橋	不明	9.4	15.0	PC橋	蒲郡市竹谷町井瀬木	市道竹谷前浜油井１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
197	無名橋１３３	不明	2.7	2.5	RC橋	蒲郡市竹谷町松田	市道竹谷足洗平畑１号線	直営	2019	Ⅰ					他事業により撤去														
198	無名橋１３４	不明	3.4	2.1	RC橋	蒲郡市西迫町松田	市道竹谷足洗平畑２号線	直営	2019	Ⅰ					他事業により撤去														
199	拾石橋	不明	13.5	12.4	鋼橋	蒲郡市拾石町小深田	市道南新田浜田１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
200	拾石橋（上流歩道）	不明	13.5	1.9	鋼橋	蒲郡市拾石町小深田	市道南新田浜田１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
201	拾石橋（下流歩道）	不明	13.5	1.9	鋼橋	蒲郡市拾石町小深田	市道南新田浜田１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
202	昭和橋２	1968	15.6	5.6	PC橋	蒲郡市拾石町前田	市道小深田向イ1号線	委託	2025	Ⅰ	2019.08	2019.11	2020.12	2021.03	断面修復	6.8					○								
203	蔵子田橋	1967	24.7	5.0	PC橋	蒲郡市拾石町口無シ	市道倉田堀ノ内1号線	委託	2025	Ⅱ	2022.09	2023.02	2023.10	2024.06	断面修復、伸縮装置補修	3.6		○		○	○								
204	野田橋	1980	29.5	7.0	鋼橋	蒲郡市拾石町大海	市道南新田浜田1号線	委託	2025	Ⅱ	2017.03	2018.03	2018.06	2018.11	伸縮装置取替	49.0					○								
205	無名橋１３５	不明	2.1	4.3	RC橋	蒲郡市鹿島町深田	市道深田中郷１号線	委託	2021	Ⅱ													○						
206	無名橋１３６	不明	5.5	6.3	RC橋	蒲郡市鹿島町浜田	市道宮ノ要中郷１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
207	無名橋１３７	不明	5.4	4.5	RC橋	蒲郡市形原町編笠	市道形原編笠鹿島中郷１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
208	無名橋１３８	不明	3.3	7.5	RC橋	蒲郡市一色町徳林	市道前田大首１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
209	無名橋１３９	不明	3.6	23.1	その他	蒲郡市金平町堀ノ内	市道倉田堀ノ内１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
210	無名橋１４０	不明	3.6	3.8	RC橋	蒲郡市金平町岩上	市道内野岩上１号線	直営	2024	Ⅲ									○					□		○	断面修復・舗装打替え・転落防止策	13.0	
211	無名橋１４１	不明	3.7	4.0	RC橋	蒲郡市一色町森下	市道内野岩上１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
212	無名橋１４２	1981	3.8	4.0	RC橋	蒲郡市一色町芝崎	市道一色向田１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
213	無名橋１４３	1987	3.8	9.8	RC橋	蒲郡市一色町大首	市道大首６号線	直営	2024	Ⅱ									○										
214	無名橋１４４	1987	4.0	4.9	RC橋	蒲郡市一色町向田	市道一色向田４号線	直営	2024	Ⅱ									○										
215	なかのがわ橋	不明	4.0	9.4	RC橋	蒲郡市形原町編笠	市道南新田浜田１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
216	岩上橋	1968	4.1	8.2	RC橋	蒲郡市金平町堀ノ内	市道長田山下１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
217	無名橋１４５	不明	4.4	1.9	鋼橋	蒲郡市形原町広田	市道形原広田１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
218	無名橋１４６	不明	4.5	5.5	RC橋	蒲郡市形原町広田	市道南淀尻廣田１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
219	無名橋１４７	1987	4.6	4.5	RC橋	蒲郡市一色町向田	市道一色向田４号線	直営	2024	Ⅰ									○										
220	無名橋１４８	1981	7.2	11.6	RC橋	蒲郡市一色町徳林	市道下郷東ノ峰１号線	委託	2021	Ⅰ													○						

別表－1

対策内容・実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検・修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
221	無名橋１４９	不明	11.7	7.7	PC橋	蒲郡市形原町北淀尻	市道北淀尻１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
222	無名橋１５０	1985	2.9	1.5	RC橋	蒲郡市金平町北沢	市道北澤東橋１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
223	無名橋１５１	不明	3.0	2.3	RC橋	蒲郡市金平町茶ノ木	市道茶ノ木向田１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
224	無名橋１５２	不明	3.2	1.4	RC橋	蒲郡市金平町内野	市道明徳内野１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
225	無名橋１５３	不明	3.7	4.0	RC橋	蒲郡市一色町森下	市道茶ノ木７号線	直営	2024	Ⅰ									○									
226	無名橋１５４	不明	3.9	4.0	RC橋	蒲郡市金平町内野	市道金平頂拝５号線	直営	2024	Ⅱ									○									
227	無名橋１５５	1985	4.0	4.0	RC橋	蒲郡市金平町北沢	市道内野東橋１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
228	無名橋１５６	不明	4.2	5.4	RC橋	蒲郡市金平町椿藪	市道明徳彼岸田１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
229	無名橋１５７	不明	5.5	2.5	RC橋	蒲郡市金平町椿藪	市道茶ノ木１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
230	無名橋１５８	不明	13.3	3.5	RC橋	蒲郡市金平町頂拝	市道金平頂拝４号線	直営	2024	Ⅱ									○									
231	上大門橋	1992	2.9	6.6	RC橋	蒲郡市金平町大門	市道金平大門７号線	委託	2021	Ⅰ													○					
232	無名橋１６０	不明	3.0	3.2	RC橋	蒲郡市金平町開戸	市道開戸２号線	直営	2024	Ⅰ									○									
233	無名橋１６１	不明	3.1	0.7	RC橋	蒲郡市金平町上大門	市道上大門２号線	委託	2021	Ⅰ													○					
234	無名橋１６２	不明	3.3	2.7	RC橋	蒲郡市金平町大門	市道金平大門１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
235	下出口橋	不明	3.3	6.6	RC橋	蒲郡市形原町出口	市道平谷出口１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
236	烏田人道橋	不明	3.5	1.1	RC橋	蒲郡市金平町烏田	市道烏田２号線	委託	2021	Ⅰ													○					
237	木白井橋	不明	3.7	4.5	RC橋	蒲郡市金平町上大門	市道上大門１号線	直営	2024	Ⅱ			2024.02	2024.03	防護柵工	0.3		○	○									
238	無名橋１６６	不明	3.7	1.9	RC橋	蒲郡市金平町上大門	市道上大門大門１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
239	下烏田橋	不明	3.7	4.0	RC橋	蒲郡市金平町烏田	市道出口荒木１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
240	上出口橋	不明	3.7	8.3	RC橋	蒲郡市形原町出口	市道平谷出口１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
241	上烏田橋	不明	4.0	2.0	RC橋	蒲郡市金平町烏田	市道烏田１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
242	出口人道橋	不明	4.0	1.8	鋼橋	蒲郡市形原町出口	市道形原出口７号線	直営	2024	Ⅱ									○									
243	下大門橋	不明	4.1	3.9	RC橋	蒲郡市金平町大門	市道大門長根１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
244	無名橋１７２	1987	4.5	1.6	RC橋	蒲郡市形原町出口	市道形原出口６号線	委託	2021	Ⅱ													○					
245	中大門橋	不明	4.6	3.3	RC橋	蒲郡市金平町大門	市道上大門大門１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
246	田中橋	不明	5.5	4.0	RC橋	蒲郡市形原町平谷	市道田中荒木１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
247	市場橋	不明	7.2	3.2	RC橋	蒲郡市形原町天神裏	市道市場５号線	直営	2024	Ⅰ									○									
248	春日浦橋	1991	20.7	16.0	PC橋	蒲郡市形原町北浜	市道春日浦2号線	委託	2025	Ⅱ	2014.06	2014.12	2014.12	2015.03	断面修復	1.0					○					○	断面修復、ひび割れ補修	3.5	
249	北浜橋	1994	22.0	11.0	PC橋	蒲郡市形原町北浜	市道春日浦1号線	委託	2025	Ⅰ	2013.03	2013.12	2015.12	2016.05	伸縮装置取替	12.0					○								
250	無名橋１７６	不明	3.4	4.4	RC橋	蒲郡市形原町鍾鋳場	市道鍾鋳場１１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
251	無名橋１７７	不明	4.0	4.0	RC橋	蒲郡市形原町大坪	市道平谷出口１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
252	無名橋１７８	不明	2.6	1.7	RC橋	蒲郡市金平町烏田	市道烏田稲荷１号線	直営	2024	Ⅰ			2024.02	2024.03	防護柵工	0.2		○	○									
253	烏帽子橋	不明	6.3	5.0	PC橋	蒲郡市形原町烏帽子	市道烏帽子４号線	直営	2024	Ⅰ									○									
254	無名橋１７９	不明	6.7	3.5	PC橋	蒲郡市形原町杉那	市道角穴１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
255	無名橋１８０	不明	8.1	1.6	鋼橋	蒲郡市形原町森口	市道森口大澤１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
256	欠上橋	不明	8.2	4.8	PC橋	蒲郡市形原町東欠ノ上	市道東欠ノ上南森１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
257	無名橋１８１	不明	8.7	1.5	鋼橋	蒲郡市形原町袋川	市道明後東欠ノ上１号線	委託	2021	Ⅱ													○					
258	無名橋１８２	不明	9.3	1.6	鋼橋	蒲郡市形原町前田	市道前田御嶽２号線	直営	2024	Ⅰ									○									
259	無名橋１８３	不明	9.3	1.2	鋼橋	蒲郡市形原町下川原	市道下音羽３号線	直営	2024	Ⅱ									○									
260	森橋	1963	9.4	4.0	PC橋	蒲郡市形原町西欠ノ上	市道西欠ノ上南森１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
261	観音橋	1959	9.4	8.0	PC橋	蒲郡市形原町下屋敷	市道会下前田１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
262	御嶽橋	1962	9.8	2.6	PC橋	蒲郡市形原町御嶽	市道前田御嶽１号線	直営	2024	Ⅰ									○									
263	無名橋１８４	不明	4.0	3.0	RC橋	蒲郡市形原町下音羽	市道下音羽三浦町１号線	直営	2024	Ⅱ									○									
264	港橋	不明	9.0	6.5	PC橋	蒲郡市西浦町北稲生	市道港町大山１号線	直営	2024	Ⅰ									○									

別表－1

対策内容・実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検・修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
265	空ケ谷２号橋	1956	5.3	4.2	RC橋	蒲郡市西浦町空ヶ谷	市道北知柄下地１号線	直営	2024	Ⅲ									○					□		○	ひび割れ補修・断面修復	13.0	
266	無名橋１８５	不明	2.7	1.5	RC橋	蒲郡市西浦町神谷門戸	市道神谷門戸１号線	委託	2021	Ⅰ													○						
267	無名橋１８６	不明	2.7	1.5	RC橋	蒲郡市西浦町神谷門戸	市道神谷門戸２号線	委託	2021	Ⅰ													○						
268	無名橋１８７	不明	2.7	1.5	その他	蒲郡市西浦町神谷門戸	市道神谷門戸３号線	委託	2021	Ⅱ													○						
269	無名橋１８８	不明	2.8	4.2	RC橋	蒲郡市西浦町神谷門戸	市道的場７号線	直営	2024	Ⅰ									○										
270	無名橋１８９	1981	2.8	4.0	RC橋	蒲郡市西浦町神谷門戸	市道神谷門戸濱田１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
271	無名橋１９０	不明	3.1	3.4	RC橋	蒲郡市西浦町浜田	市道濱田下地１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
272	無名橋１９１	不明	3.4	4.2	RC橋	蒲郡市栄町	市道栄町１５号線	委託	2022	Ⅱ															○				
273	無名橋１９２	不明	3.4	4.0	RC橋	蒲郡市旭町	市道旭町１３号線	委託	2022	Ⅰ															○				
274	無名橋１９３	不明	3.4	4.6	RC橋	蒲郡市旭町	市道旭町１４号線	委託	2022	Ⅱ															○				
275	無名橋１９４	不明	3.4	4.6	RC橋	蒲郡市旭町	市道旭町１５号線	委託	2022	Ⅱ															○				
276	千尾橋	1968	8.0	3.3	鋼橋	蒲郡市大塚町原山	市道上千尾原山１号線	委託	2021	Ⅰ													○						
277	斧磨橋	1968	8.1	7.0	鋼橋	蒲郡市大塚町斧庭	市道鎌倉三月田１号線	委託	2021	Ⅱ													○						
278	無名橋１９５	不明	2.1	3.2	RC橋	蒲郡市形原町西根崎	市道狭間西根崎１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
279	無名橋１９６	不明	2.2	2.6	RC橋	蒲郡市三谷町田尻	市道田尻鳶欠１号線	委託	2022	Ⅰ															○				
280	無名橋１９７	不明	2.2	8.4	RC橋	蒲郡市三谷町十舗	市道十舗７号線	委託	2022	Ⅱ															○				
281	無名橋１９８	不明	2.2	3.6	RC橋	蒲郡市五井町中郷	市道西郷小井戸１号線	委託	2022	Ⅰ															○				
282	無名橋１９９	2024	7.2	3.6	RC橋	蒲郡市竹谷町大久古	市道大久古８号線	直営	2023	Ⅰ			2024.1	2025.3	他事業による架替		○			◎									
283	無名橋２００	不明	2.3	1.5	RC橋	蒲郡市形原町東根崎	市道東根崎西根崎１号線	委託	2021	Ⅰ													○						
284	無名橋２０１	不明	2.4	0.9	RC橋	蒲郡市竹谷町大久古	市道大久古９号線	委託	2021	Ⅱ													○						
285	無名橋２０２	不明	2.5	2.0	RC橋	蒲郡市坂本町深山	市道深山９号線	直営	2023	Ⅰ							○												
286	無名橋２０３	不明	2.6	0.8	その他	蒲郡市柏原町尺地田	市道加治替戸尺地田１号線	委託	2021	Ⅰ													○						
287	無名橋２０４	不明	2.7	6.0	RC橋	蒲郡市形原町下市場	市道北辻下市場１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
288	無名橋２０５	不明	2.8	4.8	RC橋	蒲郡市西浦町南明柄	市道南明柄６号線	直営	2024	Ⅱ									○										
289	無名橋２０６	不明	2.9	3.9	RC橋	蒲郡市西浦町南明柄	市道南明柄７号線	直営	2024	Ⅰ									○										
290	無名橋２０７	不明	3.0	3.2	PC橋	蒲郡市三谷町鳶欠	市道田尻鳶欠１号線	委託	2022	Ⅰ															○				
291	無名橋２０８	不明	3.0	2.5	RC橋	蒲郡市坂本町深山	市道中屋敷深山１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
292	無名橋２０９	不明	3.1	4.1	RC橋	蒲郡市柏原町中田	市道小敷塚加治替戸１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
293	無名橋２１０	不明	3.3	1.6	RC橋	蒲郡市一色町松葉	市道一色中屋敷５号線	直営	2024	Ⅱ									○										
294	無名橋２１１	不明	3.7	4.0	RC橋	蒲郡市西浦町中屋敷	市道北知柄下地１号線	直営	2024	Ⅱ			2023.12	2024.1	断面修復、水切工	0.5		○	○										
295	無名橋２１２	不明	3.8	4.5	RC橋	蒲郡市坂本町助坊	市道須田深山１号線	直営	2023	Ⅰ							○												
296	無名橋２１３	不明	4.0	4.0	RC橋	蒲郡市形原町川原	市道川原下川原１号線	直営	2024	Ⅰ									○										
297	無名橋２１４	不明	4.0	5.6	RC橋	蒲郡市形原町下市場	市道市場下市場１号線	直営	2024	Ⅱ									○										
298	無名橋２１５	不明	4.2	9.2	RC橋	愛知県蒲郡市大塚町馬通	市道西屋敷西島1号線	委託	2021	Ⅰ													○						
299	無名橋２１６	1987	4.3	3.0	RC橋	蒲郡市五井町西郷	市道五井西郷８号線	委託	2022	Ⅲ			2025.11	2025.11	断面修復、防護柵工	2.4				□		○			○				
300	無名橋２１７	不明	4.7	2.0	RC橋	蒲郡市五井町高立野	市道高立野１号線	委託	2022	Ⅲ			2024.08	2024.08	撤去	0.5				△									
301	西大塚跨線橋	1963	25.3	2.6	RC橋	蒲郡市大塚町狐狭間	市道仲野狐挟間１号線	委託	2022	Ⅲ	2024.08	2025.03								□					○	○	剥落対策	297.5	
302	第三鉄砲跨線橋	1963	13.7	7.1	RC橋	蒲郡市柏原町鉄砲	市道竹谷稲荷石神１号線	委託	2025	Ⅰ	2021.06	2022.03	2023.09	2026.03	断面修復、剥落対策	178.2		○		○	○								
303	第二鉄砲跨線橋	1963	15.5	12.0	PC橋	愛知県蒲郡市柏原町鉄砲	市道宮成町小敷塚１号線	委託	2021	Ⅱ	2019.08	2020.03	2020.09	2022.03	断面修復	124.7							○						
304	下長尾跨線橋	1963	13.3	5.5	RC橋	愛知県蒲郡市大塚町下長尾	市道下千尾原山１号線	委託	2021	Ⅱ													○						
305	油井跨線橋	2008	79.6	3.5	鋼橋	愛知県蒲郡市竹谷町油井	市道油井日坂野１号線	委託	2021	Ⅰ													○						
306	広畑架道橋	1986	7.8	5.0	RC橋	蒲郡市大塚町広畑	市道広畑４号線	直営	2024	Ⅱ									○										
307	ラグーナゲートブリッジ	2001	74.0	14.7	PC橋	蒲郡市海陽町二丁目	市道海陽町１号線	委託	2025	Ⅰ	2019.08	2019.11	2020.12	2021.3	断面修復	5.0					○								
308	さかもと橋	2007	10.6	14.1	PC橋	蒲郡市坂本町向郷	市道清田大口清田欠下１号線	委託	2022	Ⅰ															○				

別表－1

対策内容･実施時期一覧表

No.	道路橋名	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	上部構造形式	所在地	路線名	最新（点検結果＋修繕状況）								今後の予定（○点検･修繕 ◎架替 △撤去 □設計）												備考
								点検方法（直営・委託）	点検実施年度	判定区分	修繕設計着手年月 yyyy.m	修繕設計完了年月 yyyy.m	修繕工事着手年月 yyyy.m	修繕工事完了年月	修繕内容（架替・撤去）	修繕金額（百万円）※ 仮設費、税込	R5年度（2023年度）		R6年度（2024年度）		R7年度（2025年度）		R8年度（2026年度）		R9年度（2027年度）		修繕内容（予定）（架替・撤去）	修繕金額（予定）（百万円）※ 仮設費、税込	
																		点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕	点検	修繕			
309	無名橋２１８	不明	5.0	5.0	RC橋	蒲郡市大塚町仲野	市道仲野下長尾１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
310	無名橋２１９	不明	3.4	11.0	RC橋	蒲郡市豊岡町軒山	市道軒山砂田１号線	委託	2022	Ⅰ														○				
311	無名橋２２０	不明	4.3	5.0	RC橋	蒲郡市三谷町毛無	市道豊岡三谷１８号線	委託	2022	Ⅱ														○				
312	無名橋２２１	不明	3.8	3.2	RC橋	蒲郡市清田町大駄和	市道上大内大駄和２号線	委託	2022	Ⅱ														○				
313	柏原第2号橋側道橋（上り）	2014	12.2	4.1	PC橋	蒲郡市原町大迫	市道大迫坂野１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
314	柏原第2号橋側道橋（下り）	2014	22.6	4.1	PC橋	蒲郡市原町大迫	市道大迫坂野２号線	委託	2022	Ⅰ														○		舗装補修	1.0	
315	大内橋	不明	9.5	4.0	RC橋	蒲郡市大塚町原山	市道上大内大駄和２号線	委託	2022	Ⅰ														○				
316	中原橋	2007	24.8	3.0	PC橋	蒲郡市柏原町石神	市道堂山中原１号線	委託	2022	Ⅱ														○				
317	無名橋２２２	不明	9.0	8.0	RC橋	蒲郡市松原町	市道七舗港町１号線	委託	2018	Ⅱ													○					
