塩津地区学校複合施設建設工事について

施工会社

鈴中工業・北川組特定建設工事共同企業体

愛豊・杉江特定建設工事共同企業体

中部・エアテム特定建設工事共同企業体

1.工事期間　着工：令和6年10月　竣工：令和8年10月

塩津地区学校複合施設建設工事　全体工程表

着工 令和 6年 09月 27日
竣工 令和 8年 10月 30日

会 社 名：鈴中工業・北川組 特定建設工事共同企業体

項目	令和6年度						令和7年度												令和8年度						
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
解体・準備工																									
杭工事																									
小学校																									
保育園																									
外構工事																									
クレーン作業			タワークレーン・クローラークレーン設置期間																						
足場作業							外部足場組立・設置期間																		
道路際作業	撤去作業																	外構工事							
土搬入搬出	盛土		残土搬出		躯体埋戻し				躯体埋戻し										場内整生						
工事車両出入り																									
大型車両出入り（予定数）																									
10ｔダンプ		50台/日																	10台/日						
コンクリートミキサー車					週に3~4日程度		60台/日																		
4~10ｔトラック		30台/日							50台/日																
トレーラー	1~6台/日																		1~6台/日						

2.周辺案内図

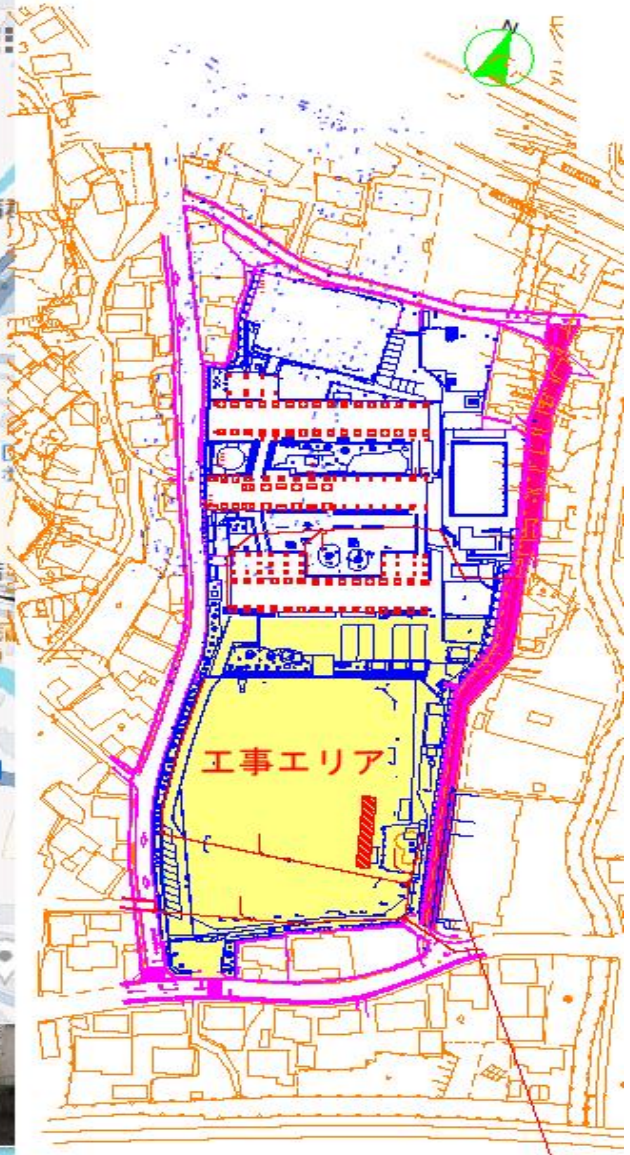

塩津地区複合施設建設工事の
工事車両通行自粛区間

3.工事計画図　令和6年10月～（予定）
解体撤去・準備工

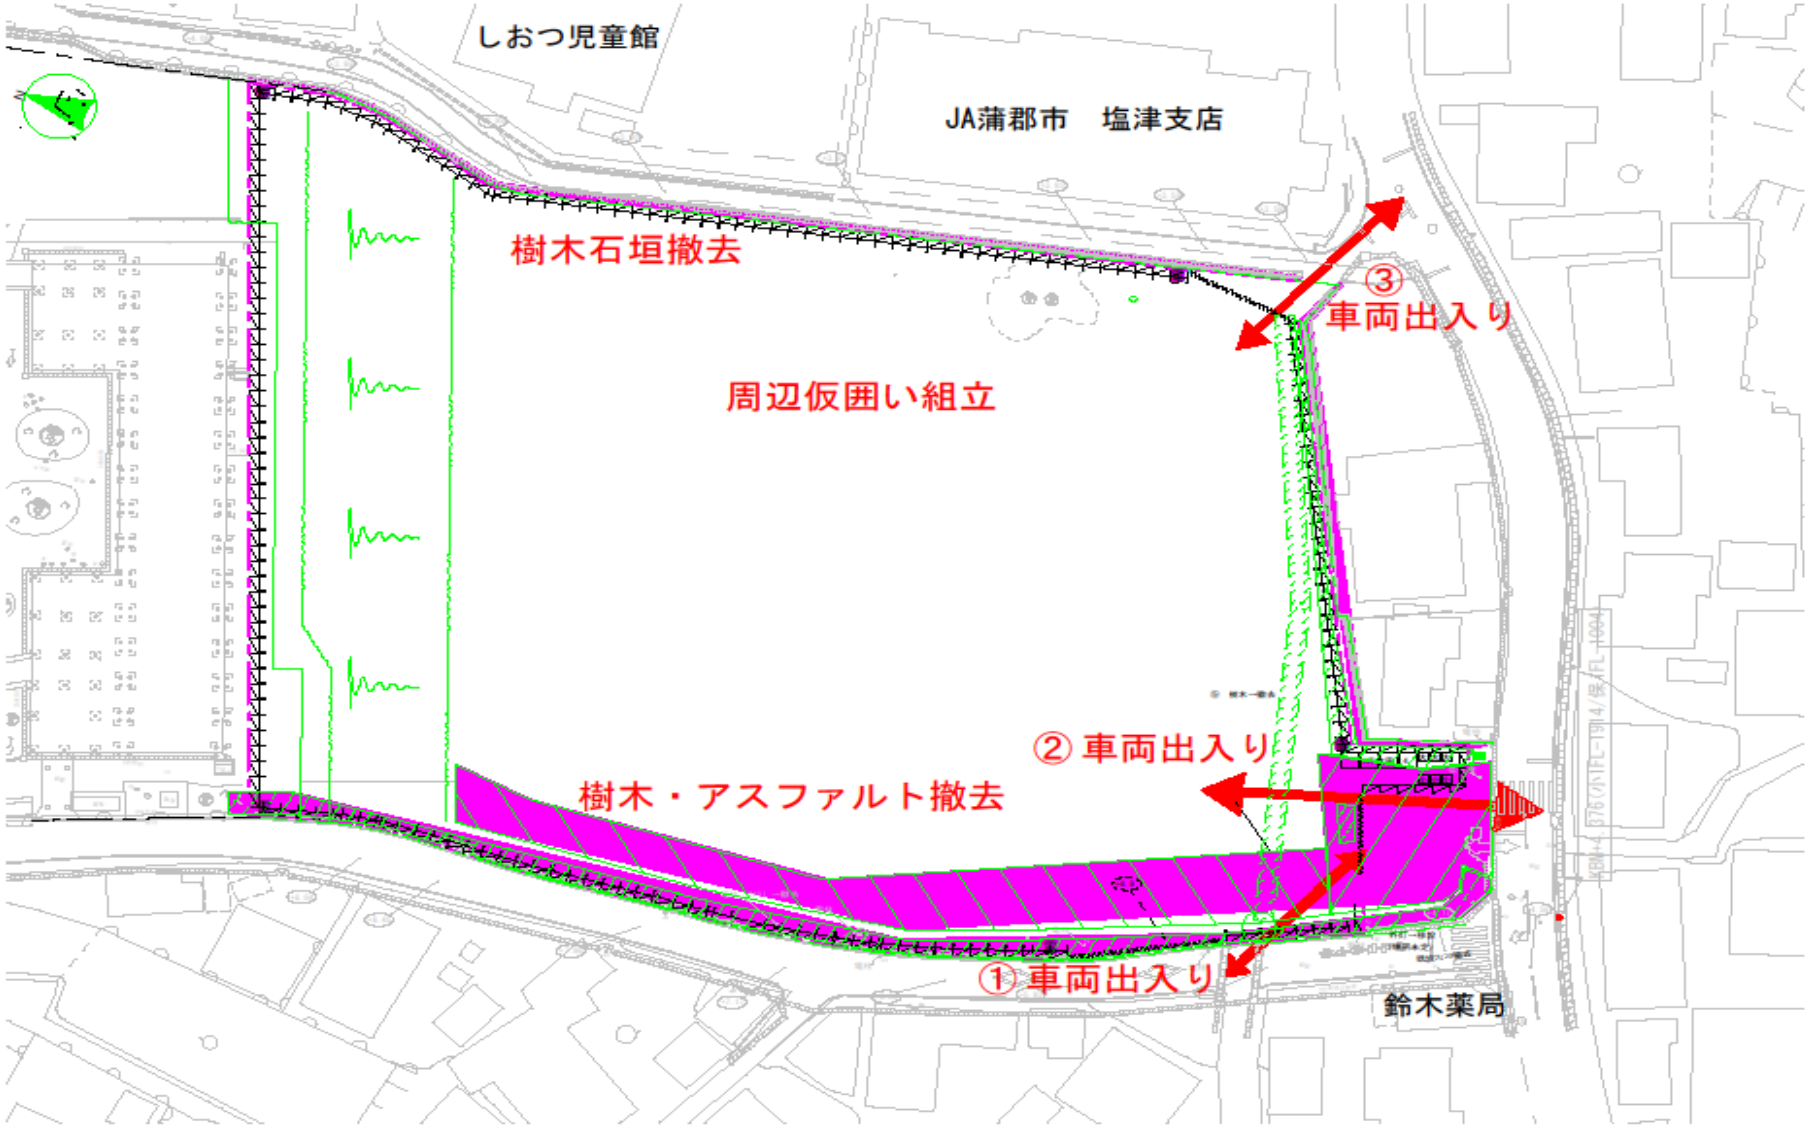

※車両出入口は警備員が誘導

3.工事計画図　令和6年12月～（予定）

杭工事

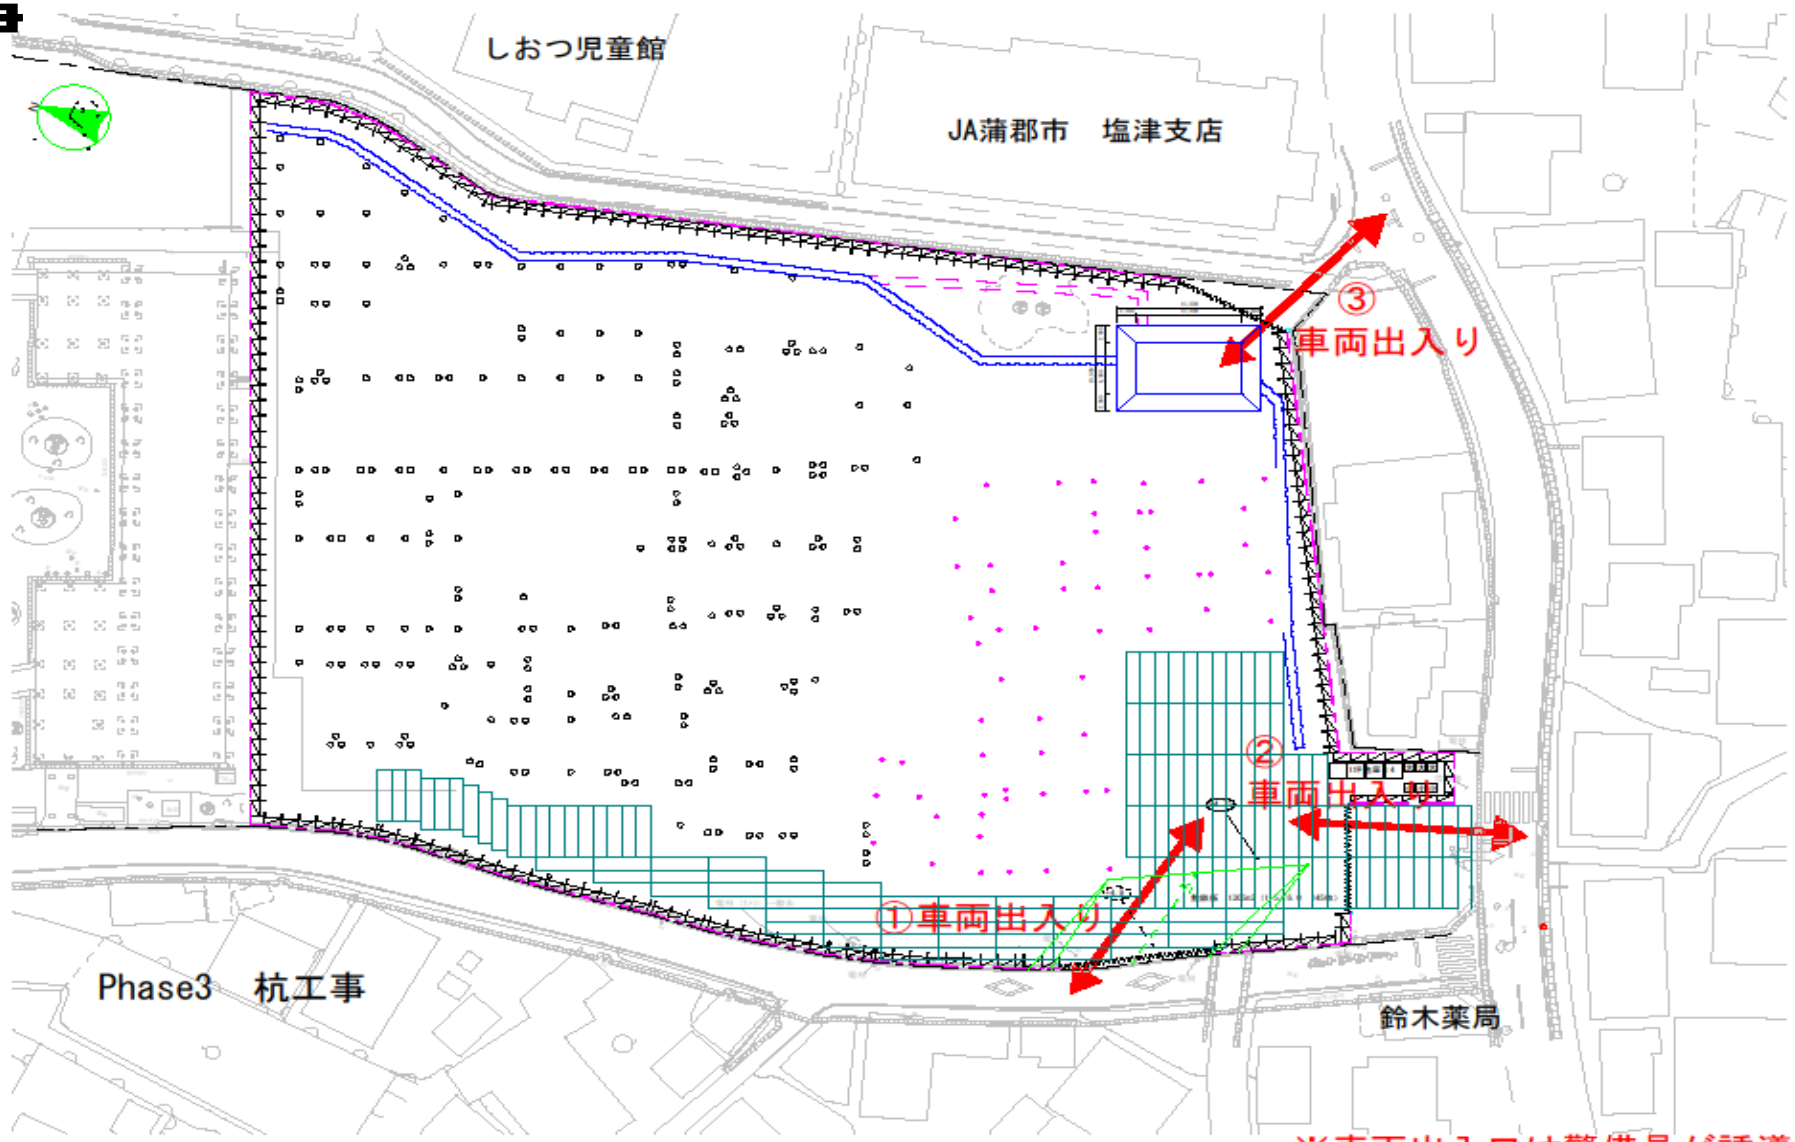

※車両出入口は警備員が誘導

3.工事計画図　令和7年1月～（予定）
小学校工事

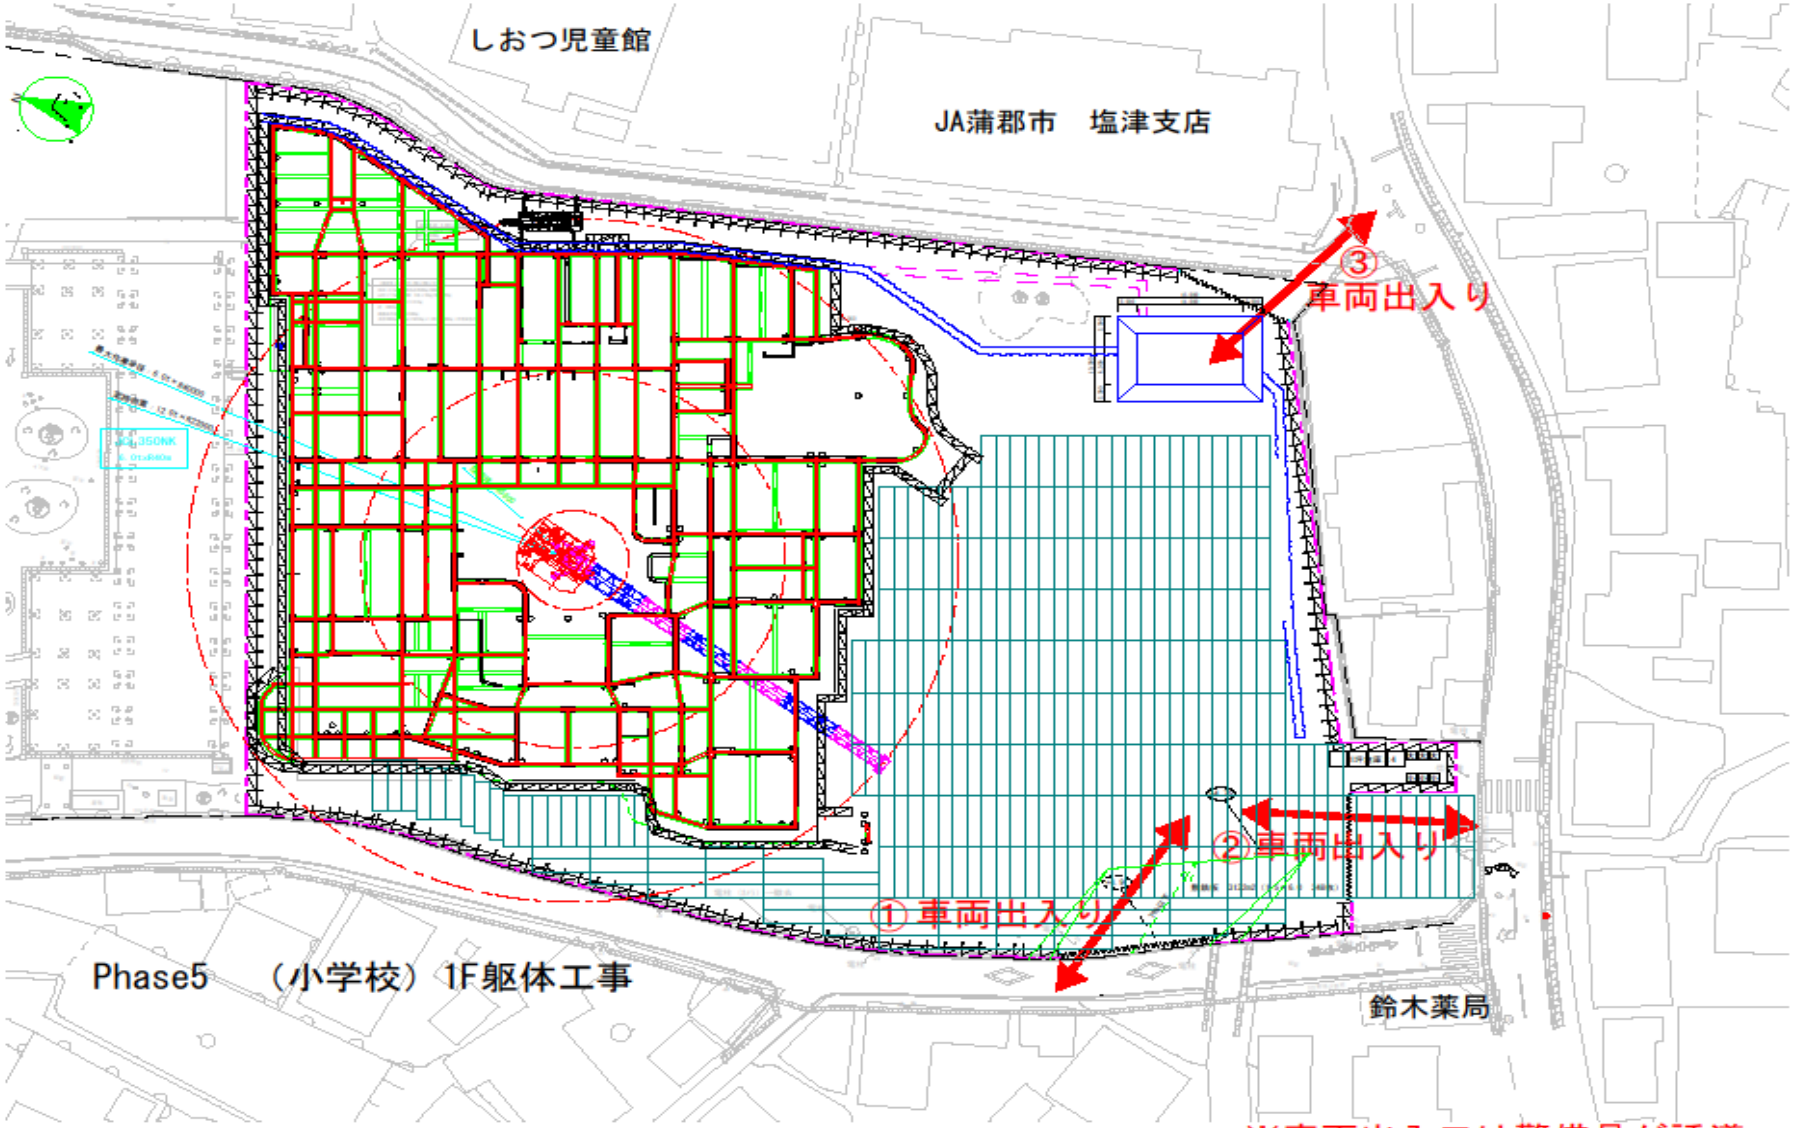

3.工事計画図　令和7年8月～（予定）

保育園工事

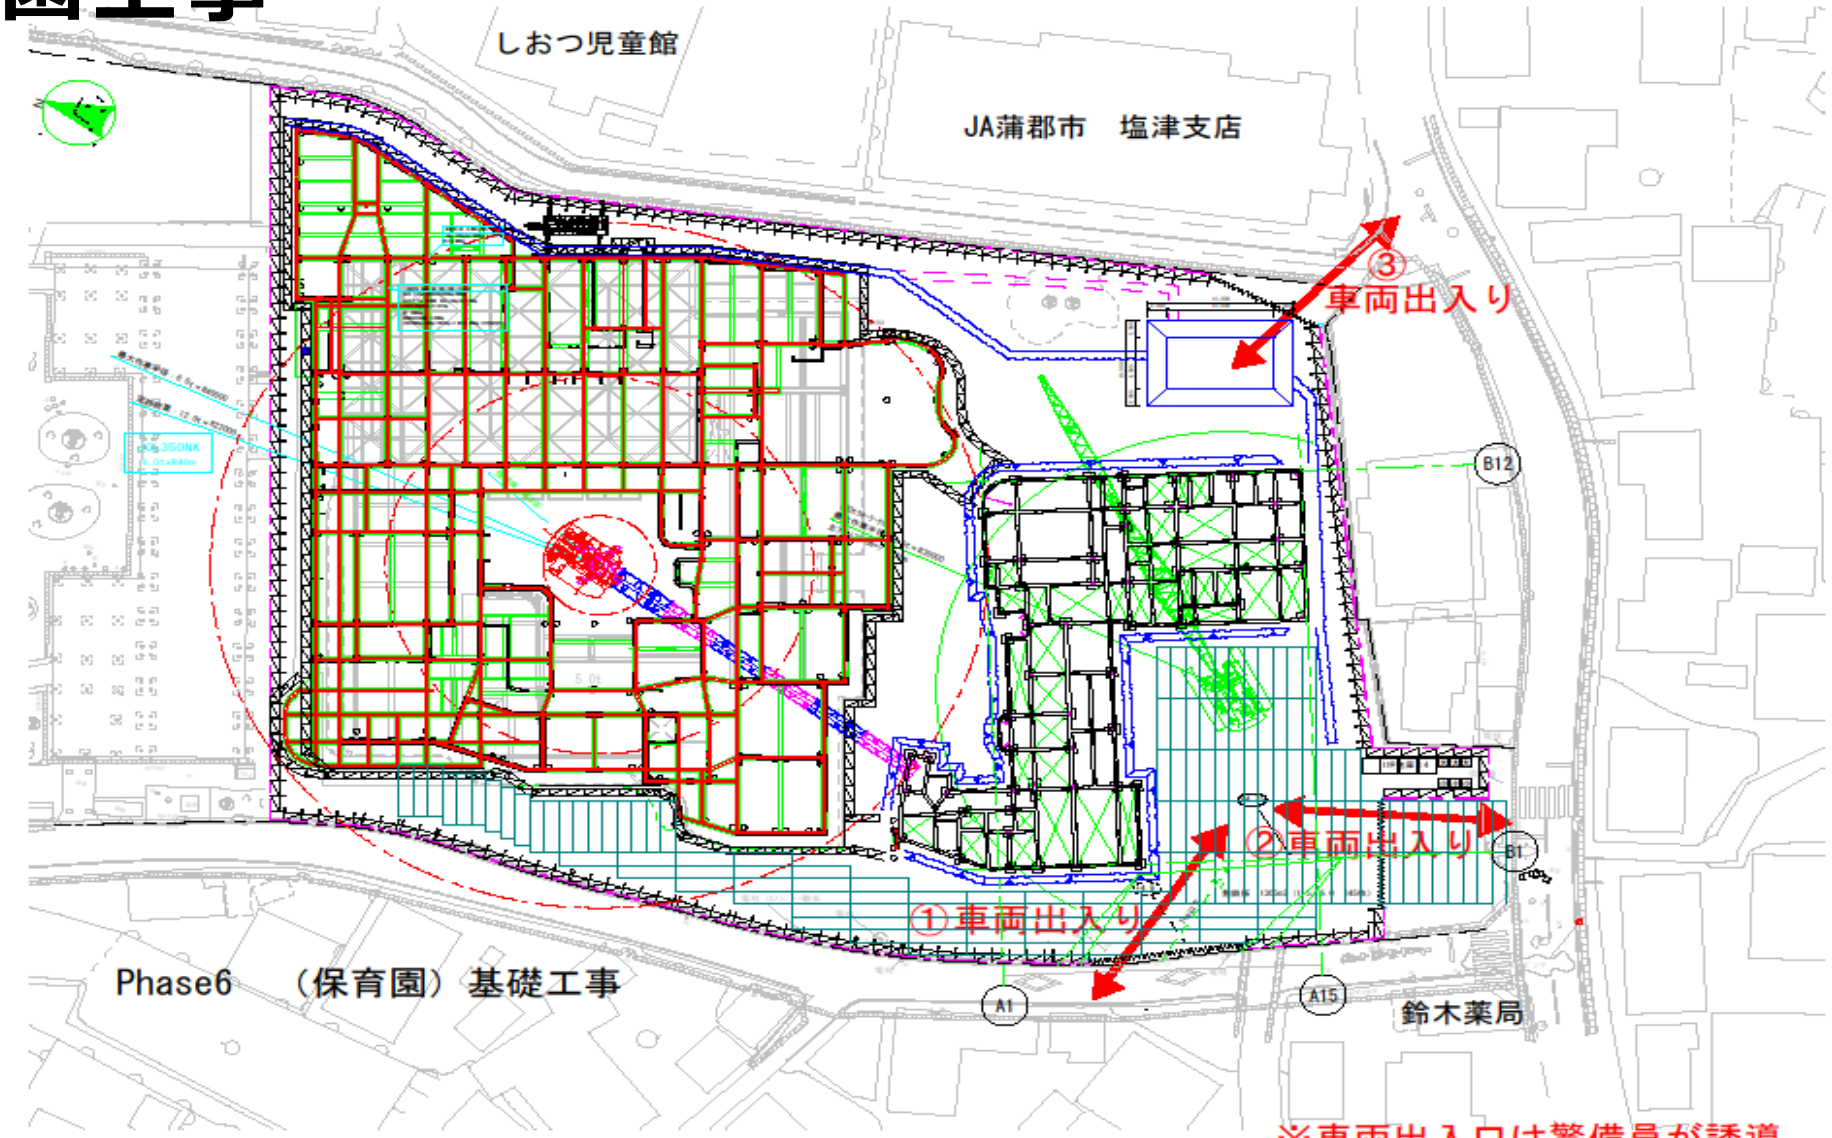

3.工事計画図　令和7年9月～（予定）
外構工事

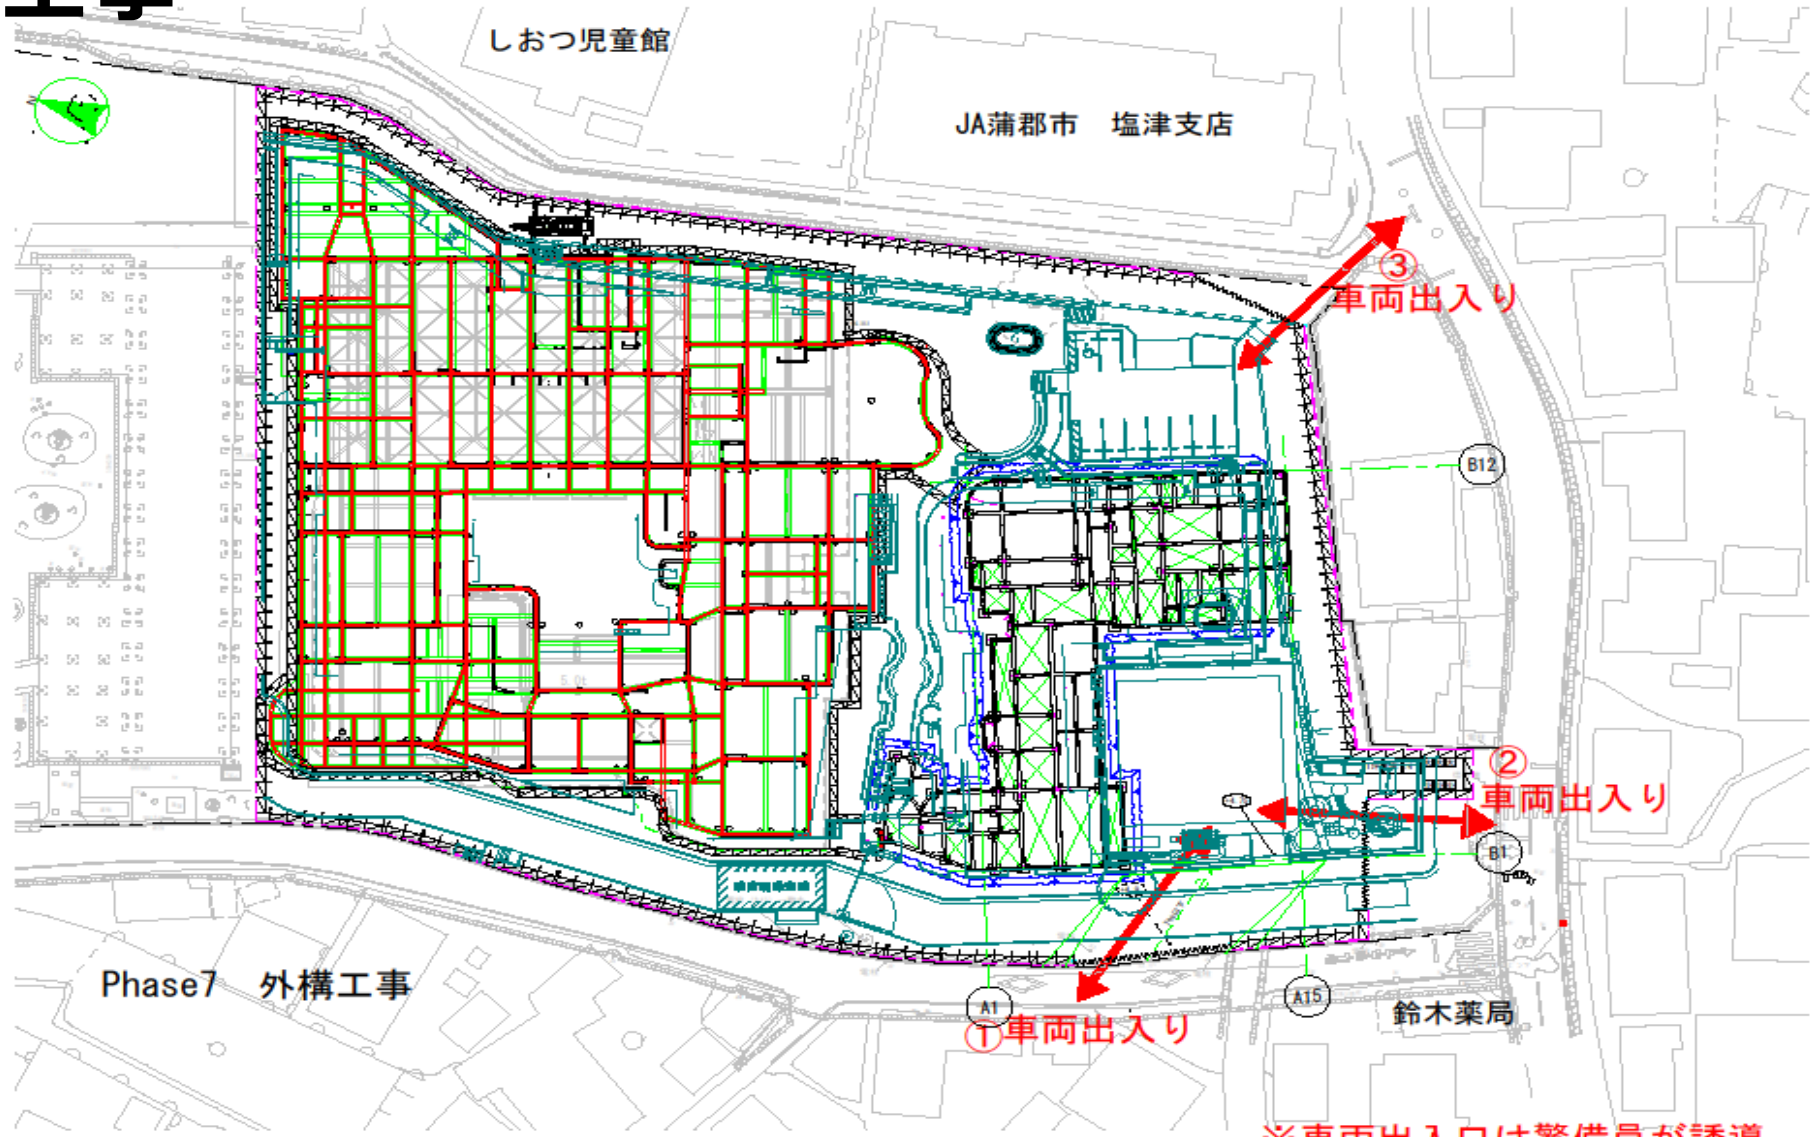

4.工事作業状況想定　令和7年7月頃（予定）

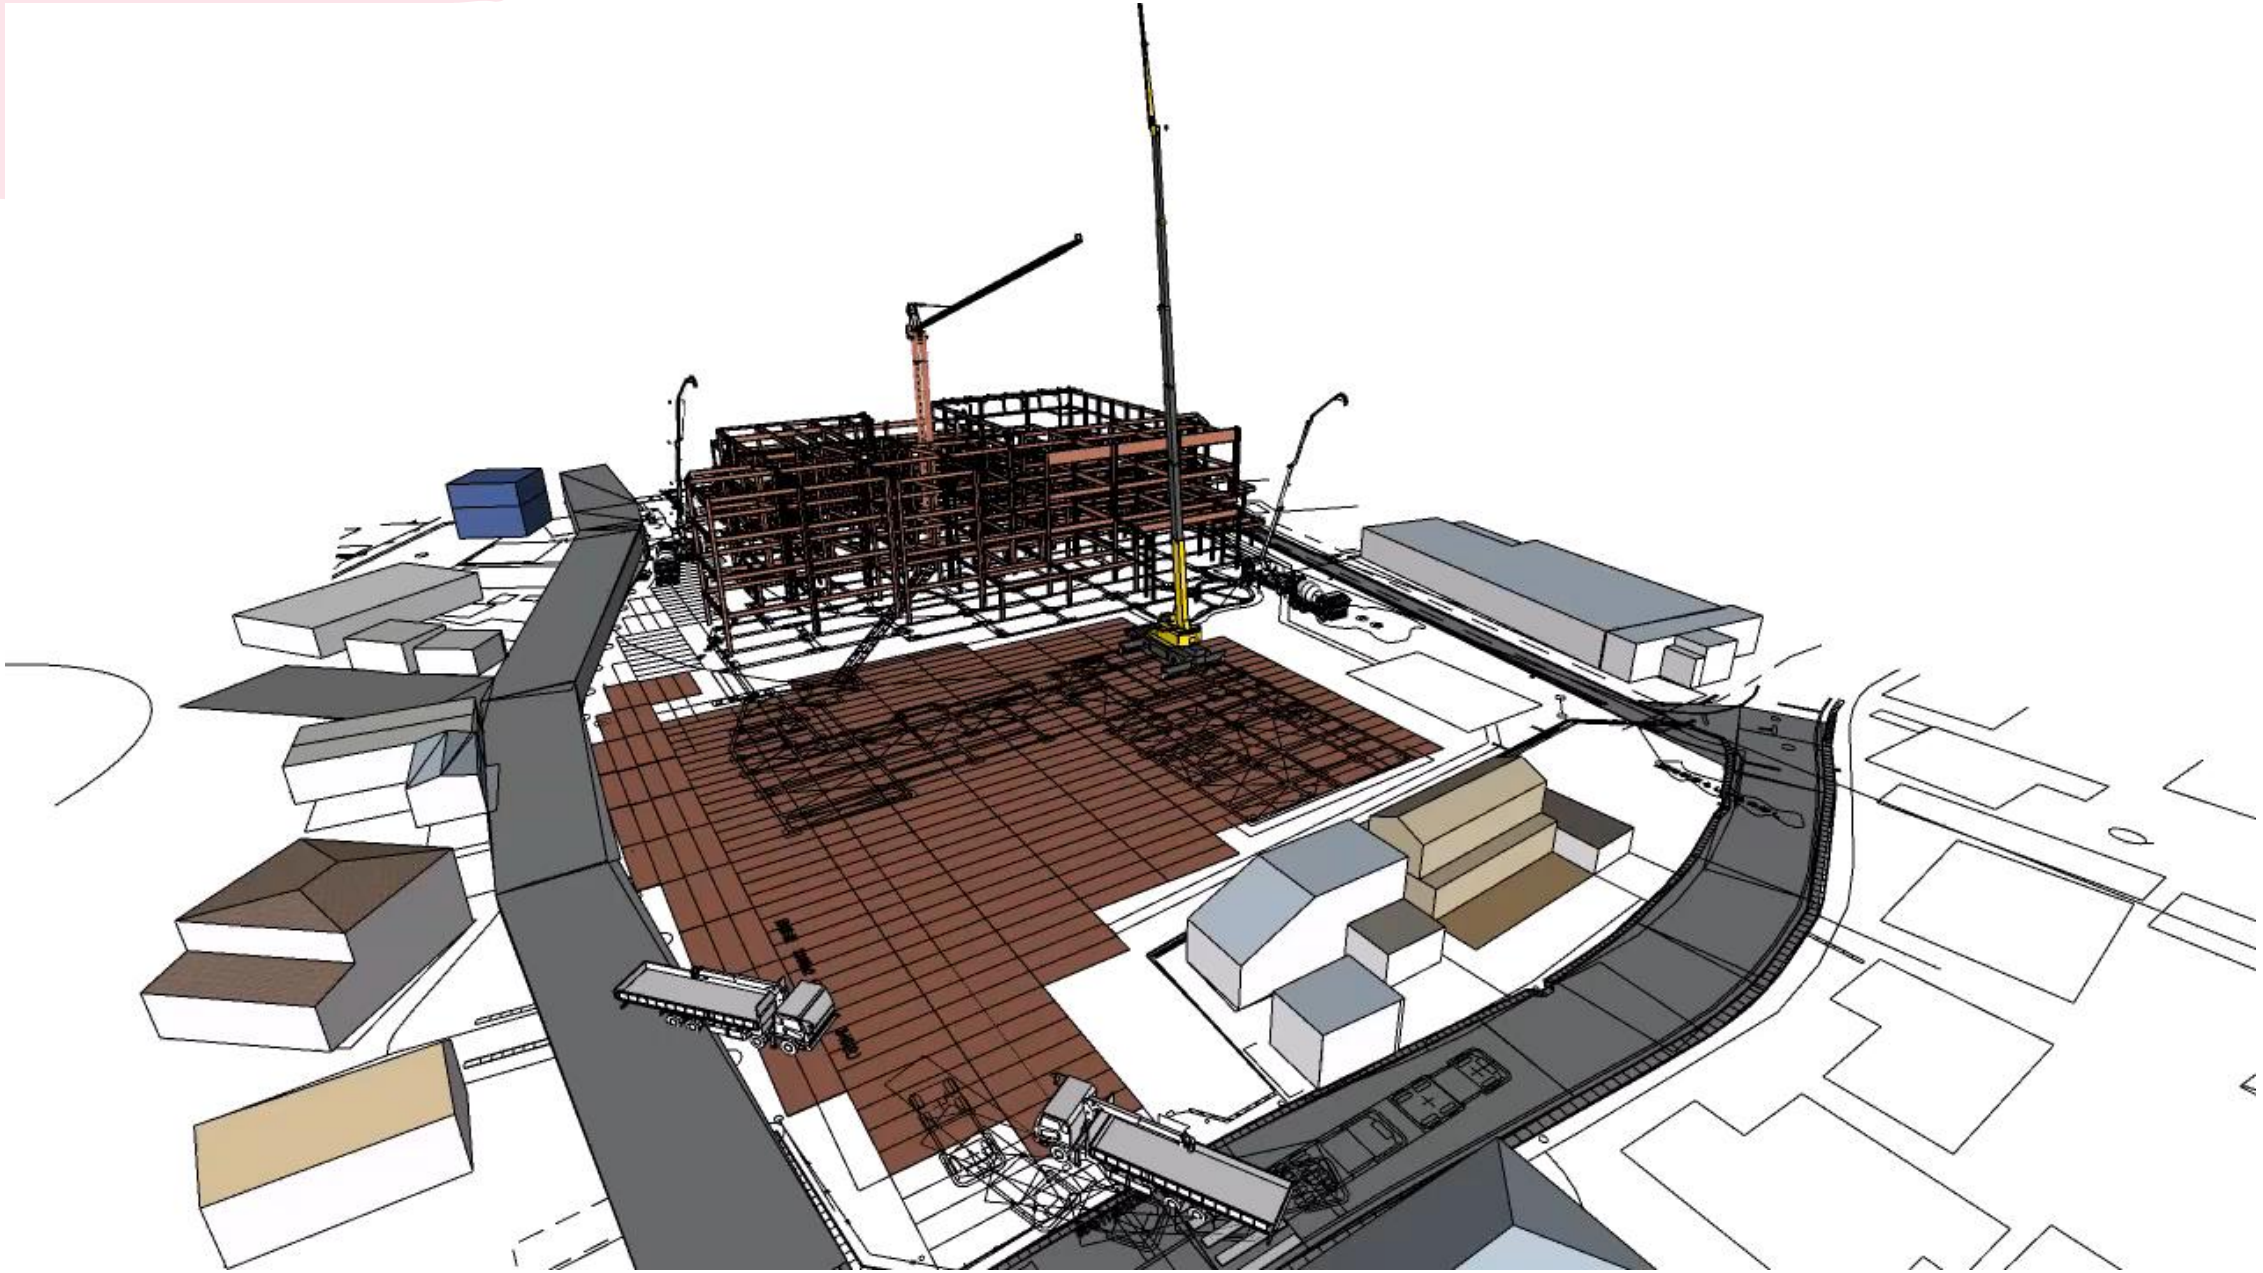

5.工事作業日

- **月曜日から土曜日とします。日曜日は原則休日とします。**
- **祝祭日等については、できるだけ騒音・振動等に配慮して作業をします。**

月	火	水	木	金	土	日
工事作業あり						原則休日

6.工事作業時間

・工事通勤車両は、敷地内での駐車を原則とし、入場は
午前6：30からとします。

・大型工事車両の入場及び出場につきましては、
原則午前8：30から午後5：30とします。

・工事準備は**原則午前7：00から**とし、後片付けは
午後7：30までとします。

・途中で中断できない作業並びに台風等の災害対策に必要な作業は、上記時間外も継続させていただく場合があります。

7.工事周知

・週間、月間の工程を現場仮囲いに掲示し、作業内容が分かるようにします。

8.工事安全対策

①工事車両は、南側出入口及び西側出入口より進入します。

②工事作業日は出入口に交通誘導員を配置し、適切に車両を誘導します。

③周辺が通学路となりますので、工事車両の徐行を徹底させます。

④工事の進捗に伴い東側からも車両を進入させる場合がございます。

⑤敷地東側、しおつ児童館前の道は工事車両の通行を自粛します。

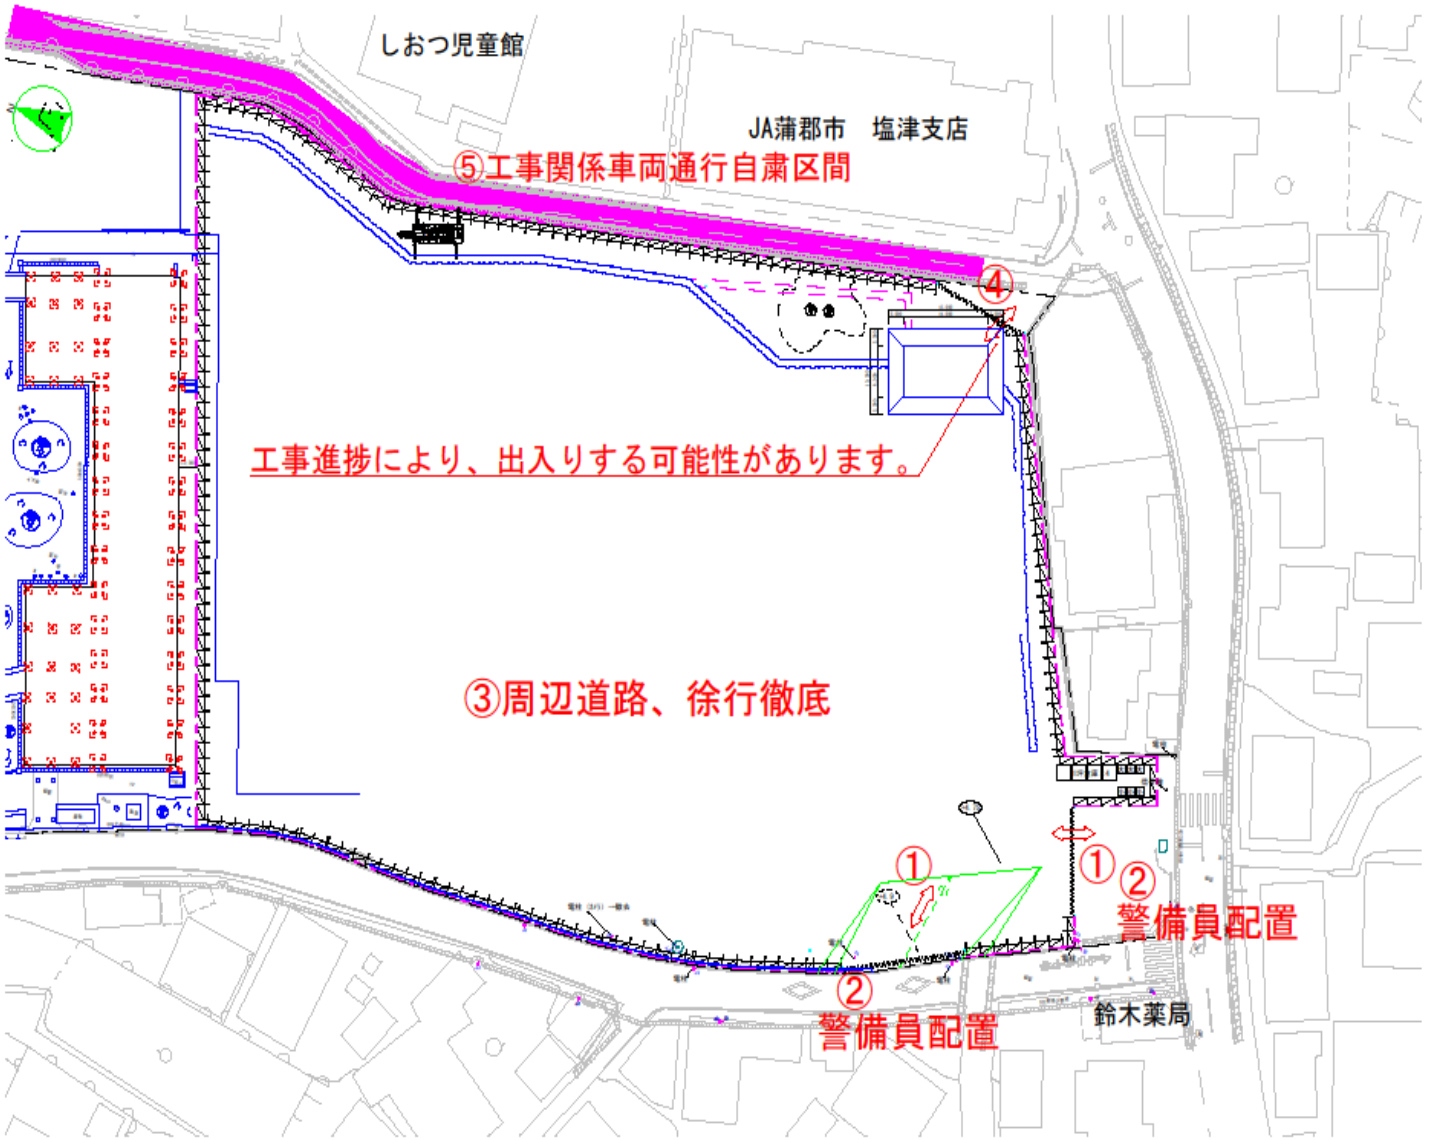

9.工事の騒音・振動等の対策

・工事用車両、建設機械や資機材については、敷地内で駐車、保管します。

・騒音、振動をなくすことはできませんが、最大限配慮して努めてまいります。また騒音振動対策のため、建設機械は低振動低騒音型を使用します。

10.工事のマナー

・工事施工箇所の周辺について、毎日清掃を行う等環境美化に努めます。

・万が一、土などで道路を汚した際には、速やかに清掃いたします。

周辺住民の皆様のご迷惑とならないよう、また安全第一で努めてまいります。

ご清聴ありがとうございました。
